

Содержание

Как указать процент выполнения задачи 3

Расчет процента выполнения узловых объектов 3

 Как рассчитывается 3

 Пример расчёта 4

 Исключение задачи из расчета % выполнения 5

Процент выполнения задач

Процент конечных задач (без дочерних) можно указать только вручную.

Процент узловых задач рассчитывается автоматически.


Как указать процент выполнения задачи

Указать процент выполнения задачи вручную, можно только если:

- задача в статусе «В работе» или «Отложен»;
- она конечная в дереве проектов (у неё нет дочерних).

Чтобы это сделать, **из списка дел на рабочем столе или из карточки задачи:**

1. клик на зелёную полосу в блоке «Статус»;
2. «Изменить процент» → ввести значение → «Сохранить».

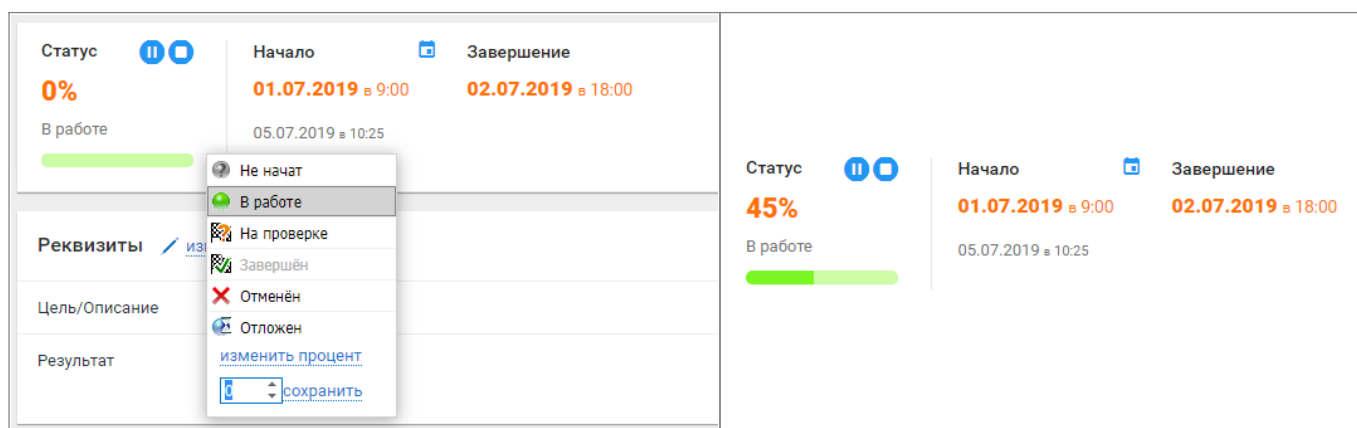

Расчет процента выполнения узловых объектов

Как рассчитывается

При расчете процента завершения узлового объекта используются:

- проценты завершения только конечных дочерних объектов, которые, в свою очередь, не имеют дочерних объектов;
- их длительности (конечных дочерних объектов, как вес) по отношению к общей длительности всех конечных задач узла/проекта.


Процент выполнения конечных задач (без дочерних) не рассчитывается системой – только вы сами, вручную можете внести % выполнения в эти задачи. Система сама по

себе не знает, как движется работа.



Пример расчёта

Рассмотрим пример расчета процента выполнения проекта «Оптимизация терминальной инфраструктуры».

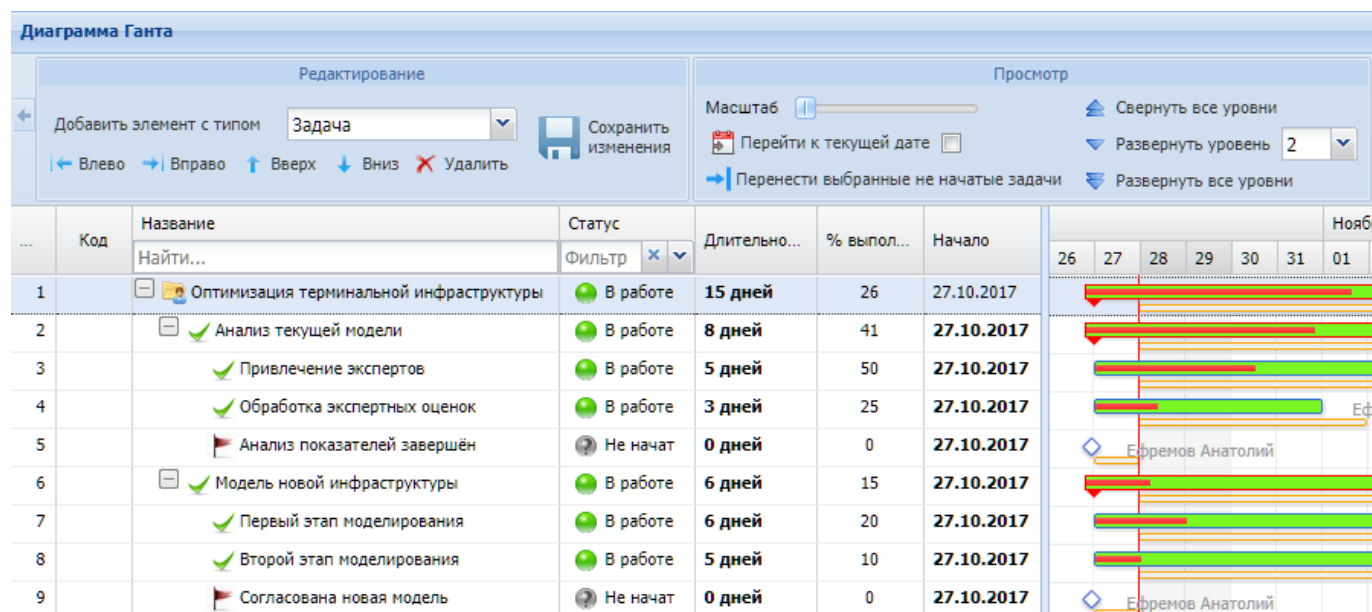

1. Расчет процента выполнения первого узла «Анализ текущей модели». Объект имеет 3 дочерних задачи, суммарная продолжительность которых составляет 8 дней (5+3+0). Длительность одной задачи делится на общую и умножается на процент выполнения данной задачи.

Процент завершения узловой задачи = $50 \cdot 5/8 + 25 \cdot 3/8 + 0 \cdot 0/8 = 31,25 + 9,375 + 0 = 40,625 \sim 41\%$.

2. Расчет процента выполнения проекта «Оптимизация терминальной инфраструктуры». Для расчета берутся длительности и проценты завершения всех дочерних задач в проекте, затем рассчитываются веса длительностей конечных работ по отношению к сумме длительностей всех конечных задач проекта и на основании этих данных рассчитывается процент выполнения проекта:

$= 50 \cdot 5/19 + 25 \cdot 3/19 + 0 \cdot 0/19 + 20 \cdot 6/19 + 10 \cdot 5/19 + 0 \cdot 0/19 = 13,157 + 3,947 + 6,315 + 2,963 = 26,382 \sim 26\%$.

Из примера видно, что контрольные точки (вехи) **из-за нулевой длительности не влияют на расчет процента выполнения узла и проекта в целом.**

Исключение задачи из расчета % выполнения

Есть задачи, которые нужны в плане проекта, но не влияют на процент выполненных работ (например, совещания). Исключите такие задачи из расчета процентов выполненных работ проекта.

Для этого:

1. **активируйте колонку** на диаграмме Ганта «Учет % выполнения»;
2. выберите в этой колонке задачи, которые не нужно учитывать в расчете процентов выполнения проекта.

Диаграмма Ганта

Редактирование

Добавить элемент с типом: **Задача**

Сохранить изменения

Просмотр

Масштаб

Перейти к текущей дате

Перенести выбранные не начатые задачи

Свернуть все уровни

Развернуть уровень 3

Развернуть все уровни

...	Код	Название	Статус	...	Учет % выполн...	Начало
1		Комплексное переоснащение цеха для ООО "	В работе		<input checked="" type="checkbox"/>	11.06.2014
2		План проекта	В работе		<input checked="" type="checkbox"/>	13.06.2014
12		Контракты с заказчиком	Не начат		<input checked="" type="checkbox"/>	11.06.2014
14		Контракты с подрядчиками	Не начат		<input checked="" type="checkbox"/>	13.06.2014
19		Совещания проекта	Не начат		<input type="checkbox"/>	13.06.2014
20		Обсуждение Устава проекта	Не начат		<input checked="" type="checkbox"/>	13.06.2014
21		Поручения	В работе		<input checked="" type="checkbox"/>	11.06.2014

На карточке проекта и в иерархической структуре проценты выполнения будут зачеркнуты.

Все проекты / Проекты для заказчиков / Комплексные проекты / Комплексное переоснащение цеха д...

Совещания проекта

Воронов Олег
Руководитель

Сидоров Андрей
Исполнитель

Статус

0%

В работе

Начало **Завершение**

13.06.2014 в 8:00 **13.06.2014 в 18:00**

13.10.2017 в 13:59

Если папку с совещаниями исключить из расчета процента выполнения, то все совещания будут учитываться в проценте выполнения работ в папке с совещаниями, но итоговый результат не будет учтен в проекте.

[Назад](#)[Вперёд](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/users/project/3_3?rev=1562325688Last update: **05.07.2019 11:21**
