


Содержание


Отклонение от базового плана

Вы можете как сравнить базовый план с оперативным, так и сравнивать базовые планы разных периодов между собой.

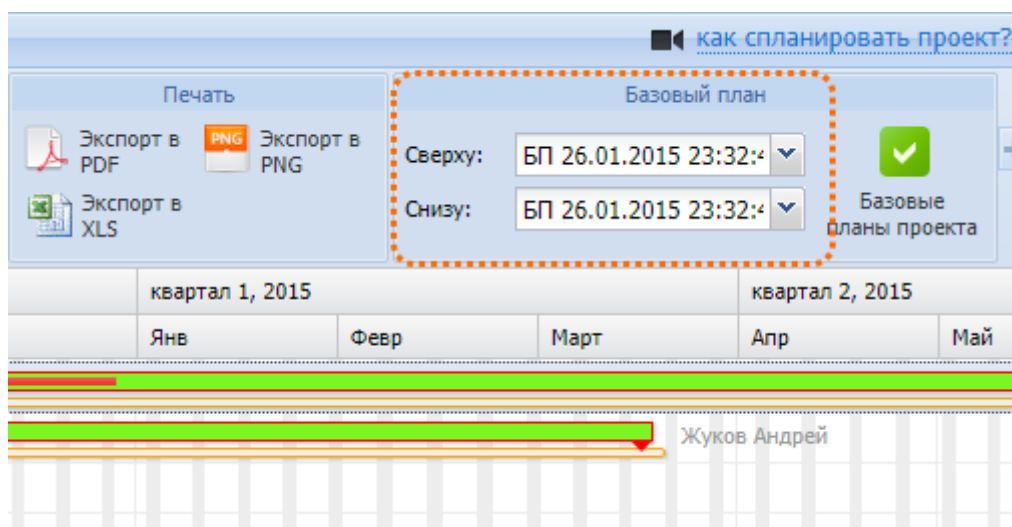

Наглядно базовый план отображается в диаграмме Ганта. Здесь вы можете:

1. вывести базовый план в графическую часть диаграммы и сравнить «колбаски» задач между собой;

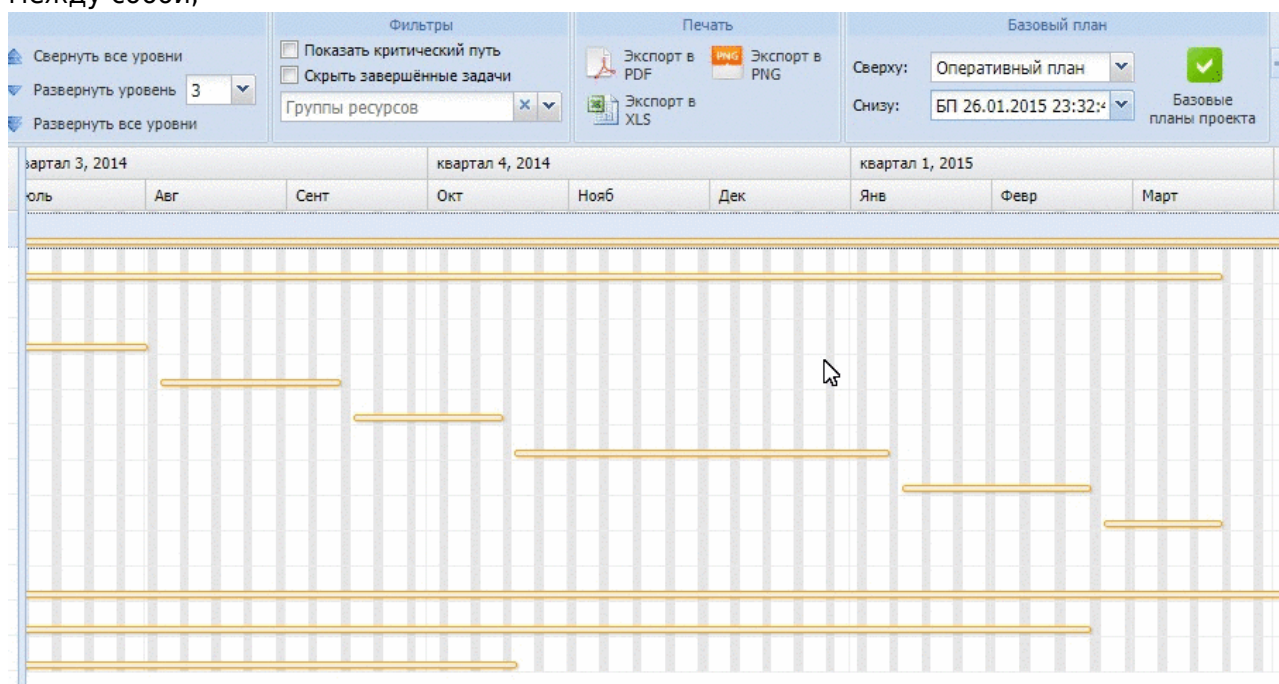

2. вывести все даты всех БП в табличную часть.

Название	Статус	Начало	Окончание	Длительно...	% выпол...	Исполнитель	Ресурс	Трудоз
Найти...	↑ ↓	Сортировать по возрастанию				Фильтр	Фильтр	
Комплексное переосна...	↓ ↑	Сортировать по убыванию						
План проекта	Удалить сортировку							
Инициация прое...	Столбцы							
Разработка ТЗ	В работе	23.06.2014	13.06.2015	263 дней	55	Ковалева Светлана		1114 ч
Разработка прое...	Завершён	04.08.2014	20.03.2015	201 дней	56	Жуков Андрей		1098 ч
Поставка оборуд...	В работе	15.09.2014	20.06.2014	6 дней	100	Жуков Андрей		17 час
Выполнение СМР	В работе	01.08.2014	01.08.2014	30 дней	99	Жуков Андрей		64 час
ПНР	Завершён	12.09.2014	12.09.2014	30 дней	100	Жуков Андрей		120 час
Запуск объекта	В работе	15.09.2014	17.10.2014	25 дней	2	Жуков Андрей		232 час
Совещания проекта	Не начат	20.10.2014	09.01.2015	60 дней	0	Жуков Андрей		216 час
Поручения	Не начат	12.01.2015	20.02.2015	30 дней	100	Жуков Андрей		281 час
Контракты с заказчи...	В работе	23.02.2015	20.03.2015	20 дней	77	Жуков Андрей		168 час
Контракты с подряд...	В работе	13.06.2014	13.06.2014	1 день	100	Ковалева Светлана		
	В работе	11.06.2014	13.06.2015	263 дней	78	Иванова Анна		
	В работе	11.06.2014	20.02.2015	183 дней	0	Ковалева Светлана		
	Не начат	13.06.2014	20.10.2014	92 дней	0	Ковалева Светлана		16 час

В графической части есть ограничение: одновременно можно вывести только два плана, причём неважно каких (базовый(ые), оперативный или факт-прогноз)

[Назад](#)
[Вперёд](#)

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/users/project/6_2?rev=1562325690

Last update: **05.07.2019 11:21**

