

## Содержание

<b>Проблемы</b> .....	3
<b>Выгоды</b> .....	3
<b>Назначение</b> .....	3
<b>Компоненты решения</b> .....	3
<b>Автоматизируемые функции и процессы</b> .....	3
<b>Особенности</b> .....	3
<b>Описание и иллюстрации</b> .....	4
<b>Обратная связь</b> .....	5



# B21 Автоматизированная актуализация плана-графика проекта на основе фактических данных о выполнении работ проекта

БП, через тсл

## Проблемы

1. Срыв сроков выполнения проектов при отсутствии актуальных оперативных планов проектов.
2. Отсутствие времени у РП на управление планом проекта.

## Выгоды

Сокращение затрат времени РП на актуализацию оперативных планов проектов, т.к. Система самостоятельно актуализует график в зависимости от имеющихся фактических дат.

## Назначение

1. Своевременная актуализация плана-графика проекта сразу после ввода фактических данных о выполнении работ проекта.
2. Снижение загрузки РП.

## Компоненты решения

- Настройки ИСУП
- Триггеры

## Автоматизируемые функции и процессы

- Разработка расписания

## Особенности

1. При появлении у объекта фактической даты начала плановая дата окончания пересчитывается: фактическая дата начала + плановая длительность, после чего связь удаляется

2. При появлении у объекта фактической даты окончания плановая дата окончания приравнивается к фактической, при наличии связи с предшественником данная связь удаляется
3. График проекта перестраивается согласно связям, установленных в задачах-последователях (функция планировщика д. Ганта)
4. График проекта не будет перестраиваться автоматически, если исполнители не будут работать со своими активностями (переводить в работу, отправлять на проверку)

## Описание и иллюстрации

1) Пользователь еще не взял задачи в работу, нет фактической даты начала

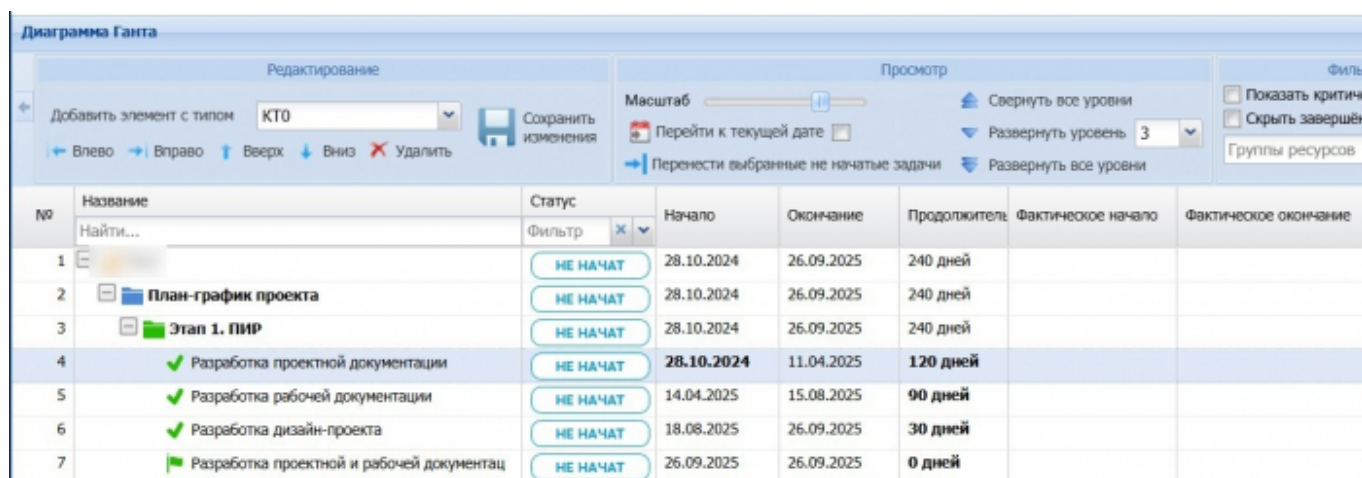


Diagramma Ганта

Редактирование: Добавить элемент с типом КТО, Сохранить изменения, Влево, Вправо, Вверх, Вниз, Удалить

Просмотр: Масштаб, Свернуть все уровни, Развернуть уровень 3, Развернуть все уровни, Показать критиче, Скрыть заверше, Группы ресурсов

№	Название	Статус	Начало	Окончание	Продолжитель	Фактическое начало	Фактическое окончание
1	Найти...	НЕ НАЧАТ	28.10.2024	26.09.2025	240 дней		
2	План-график проекта	НЕ НАЧАТ	28.10.2024	26.09.2025	240 дней		
3	Этап 1. ПИР	НЕ НАЧАТ	28.10.2024	26.09.2025	240 дней		
4	✓ Разработка проектной документации	НЕ НАЧАТ	<b>28.10.2024</b>	11.04.2025	<b>120 дней</b>		
5	✓ Разработка рабочей документации	НЕ НАЧАТ	14.04.2025	15.08.2025	<b>90 дней</b>		
6	✓ Разработка дизайн-проекта	НЕ НАЧАТ	18.08.2025	26.09.2025	<b>30 дней</b>		
7	✓ Разработка проектной и рабочей документац	НЕ НАЧАТ	26.09.2025	26.09.2025	<b>0 дней</b>		

2) Пользователь взял задачи в работу, есть фактическая дата начала

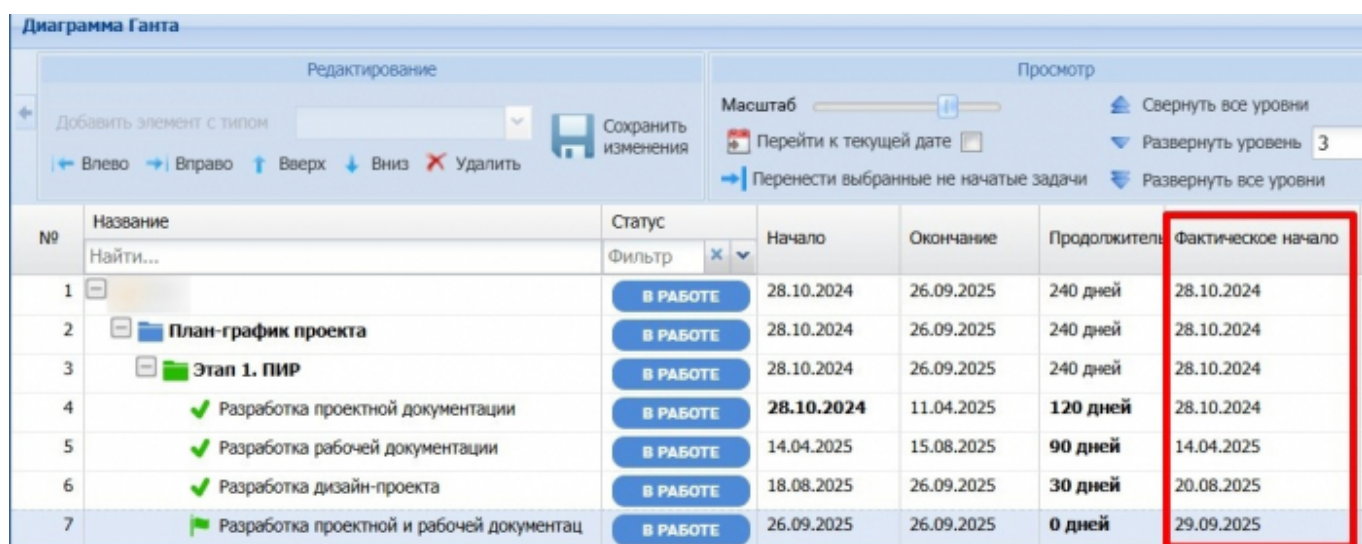


Diagramma Ганта

Редактирование: Добавить элемент с типом, Сохранить изменения, Влево, Вправо, Вверх, Вниз, Удалить

Просмотр: Масштаб, Свернуть все уровни, Развернуть уровень 3, Развернуть все уровни, Показать критиче, Скрыть заверше, Группы ресурсов

№	Название	Статус	Начало	Окончание	Продолжитель	Фактическое начало
1	Найти...	В РАБОТЕ	28.10.2024	26.09.2025	240 дней	28.10.2024
2	План-график проекта	В РАБОТЕ	28.10.2024	26.09.2025	240 дней	28.10.2024
3	Этап 1. ПИР	В РАБОТЕ	28.10.2024	26.09.2025	240 дней	28.10.2024
4	✓ Разработка проектной документации	В РАБОТЕ	<b>28.10.2024</b>	11.04.2025	<b>120 дней</b>	28.10.2024
5	✓ Разработка рабочей документации	В РАБОТЕ	14.04.2025	15.08.2025	<b>90 дней</b>	14.04.2025
6	✓ Разработка дизайн-проекта	В РАБОТЕ	18.08.2025	26.09.2025	<b>30 дней</b>	20.08.2025
7	✓ Разработка проектной и рабочей документац	В РАБОТЕ	26.09.2025	26.09.2025	<b>0 дней</b>	29.09.2025

3) Плановая дата начала приняла значения фактической даты начала

Диаграмма Ганта

Редактирование

Добавить элемент с типом

Сохранить изменения

Просмотр

Масштаб

Свернуть все уровни

Перейти к текущей дате

Развернуть уровень 3

Развернуть все уровни

Влево Вправо Вверх Вниз Удалить

№	Название	Статус	Начало	Окончание	Продолжительность	Фактическое начало
1		В РАБОТЕ	28.10.2024	30.09.2025	242 дней	28.10.2024
2	План-график проекта	В РАБОТЕ	28.10.2024	30.09.2025	242 дней	28.10.2024
3	Этап 1. ПИР	В РАБОТЕ	28.10.2024	30.09.2025	242 дней	28.10.2024
4	✓ Разработка проектной документации	В РАБОТЕ	28.10.2024	11.04.2025	120 дней	28.10.2024
5	✓ Разработка рабочей документации	В РАБОТЕ	14.04.2025	15.08.2025	90 дней	14.04.2025
6	✓ Разработка дизайн-проекта	В РАБОТЕ	20.08.2025	30.09.2025	30 дней	20.08.2025
7	Разработка проектной и рабочей документац	В РАБОТЕ	29.09.2025	29.09.2025	0 дней	29.09.2025

## Обратная связь

\*\*Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA\*\*

[Хочу так же](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects\\_and\\_tasks/planning/auto\\_project\\_schedule](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/auto_project_schedule)

Last update: 16.01.2026 14:00

