

# Содержание

<b>Проблемы</b> .....	3
<b>Выгоды</b> .....	3
<b>Назначение</b> .....	3
<b>Компоненты решения</b> .....	3
<b>Автоматизируемые функции и процессы</b> .....	4
<b>Особенности</b> .....	4
<b>Иллюстрация настроенного решения</b> .....	4



# B07 Управление проектами по директивным точкам - авторская методология Андрея Вачегина

БП, настройка, через тсл

## Проблемы

1. Отсутствие единой картины о ходе выполнения проектов.
2. Сложности с определением проблемных проектов.
3. Сильное влияние уровня подготовки РП на достоверность информации о ходе проекта.
4. Взять под контроль множество проектов вне зависимости от их типа и продолжительности.

## Выгоды

1. Наличие достоверной и сравнимой информации о разных типах проектов вне зависимости от уровня подготовки РП для мониторинга и контроля хода выполнения за счет единой технологии управления с применением директивных точек.
2. Максимально прозрачное понимание, как сдвиг одного типа проектов в портфеле/программе повлияет на весь портфель/программу по срокам/бюджету/ресурсам и в целом на финансовые показатели компании.
3. ГД избавлен от ручного/интуитивного контроля, видит, что на что влияет в моменте, какие лучше решения принять.

## Назначение

1. Метод директивных точек, позволяет взять под контроль весь портфель проектов, вне зависимости от типов проектов, подготовки РП и продолжительности проектов. Нет необходимости обучать РП, как планировать, достаточно сформировать по определенным правилам контрольные позиции, из чего сложится картина по всем проектам.
2. Решение включает в себя проверку валидности данных по проектам. Когда данные валидны, тогда принимают решения по критериям:
  - отставание проектов;
  - проблемность.
3. Нет необходимости строить сложные графики. Графики могут оставаться адаптивными под технологию управления, применяемую РП.

## Компоненты решения

- Выделение отдельного типа объектов - директивные точки (ДТ). Методология управления ДТ.

- Сбор статусов о ходе проектов, получение управляющих воздействий.

## Автоматизируемые функции и процессы

Основные функции управления проектами.

Решение включает в себя проверку валидности данных по проектам. Когда данные валидны, тогда принимают решения по критериям:

- отставание проектов;
- проблемность.


## Особенности

- Нет необходимости обучать РП, как планировать, достаточно сформировать по определенным правилам контрольные позиции, из чего сложится картина по всем проектам.
- Нет необходимости строить сложные графики. Графики могут оставаться адаптивными под технологию управления, применяемую РП.


## Иллюстрация настроенного решения

Метод Директивных точек – это правила ведения планов-графиков проектов с возможностью выстроить контроль всего Портфеля проектов Компании со стороны топ-менеджеров вне зависимости от типов проектов и уровня подготовки Планировщиков.

Руководитель проекта с помощью настроенного шаблона выбирает необходимый набор директивных точек с учетом особенностей конкретного направления и зависимостей между этапами. Даты и последовательность рассчитываются по заданным правилам, а при необходимости руководитель может скорректировать параметры в допустимых пределах.

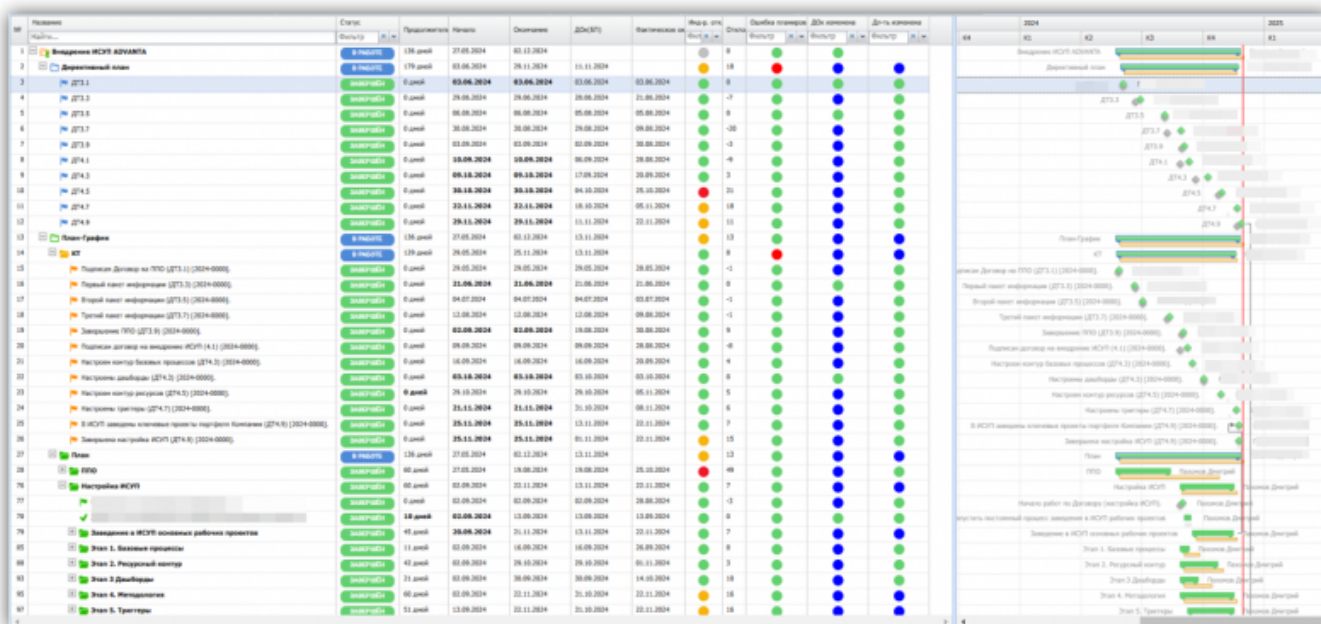

Каждая директивная точка проходит автоматическую проверку валидности: система контролирует целый ряд параметров, которые позволяют руководству быть уверенным в качестве вводимой информации. Если данные неполные или нарушена логика исполнения, проект получает специальный индикатор для контроля.

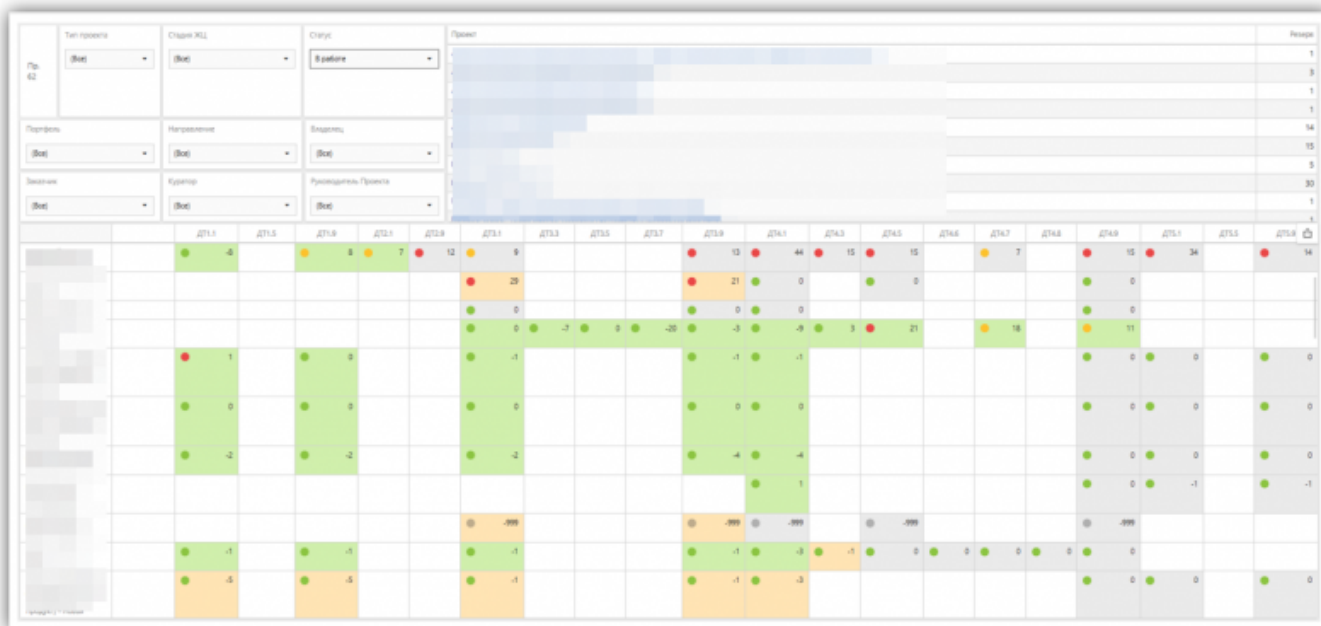

**Если Вам интересно подробнее узнать о возможностях платформы и решений на базе ADVANTA, то Вы можете связаться с нами:**  
[Запросить демоверсию](#)

Last update: 05.12.2025 13:17 opportunities:projects\_and\_tasks:planning:directive\_points [https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects\\_and\\_tasks/planning/directive\\_points?rev=1764940666](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/directive_points?rev=1764940666)

---

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects\\_and\\_tasks/planning/directive\\_points?rev=1764940666](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/directive_points?rev=1764940666)

Last update: **05.12.2025 13:17**

