

Содержание

Проблемы	3
Выгоды	3
Назначение	3
Компоненты решения	3
Автоматизируемые функции и процессы	3
Описание и иллюстрации	3
Обратная связь	5

B23 Запрет переноса плановых дат работ на период после плановой даты проекта /этапа

БП, через тсл

Проблемы

1. Срыв сроков выполнения проектов при отсутствии процедур подконтрольного изменения сроков проектов.
2. Высокие трудозатраты РП на управление планом проекта.

Выгоды

1. Сокращение срывов сроков проектов за счет более проактивного управления проектами.
2. Управляемое изменение сроков проектов.

Назначение

Предотвратить бесконтрольный перенос сроков работ проекта участниками проекта.

Компоненты решения

- Триггер

Автоматизируемые функции и процессы


- Контроль расписания

Решение страхует от внесения изменений в план-график, которые увеличивают срок проекта.

Триггер для проверки переноса плановой даты за пределы плановой даты у родительского объекта. Если исполнитель устанавливает плановую дату задачи за пределами диапазона дат у родительского объекта, руководитель проекта согласовывает это изменение, триггер не дает перенести даты и присылает уведомление.

Описание и иллюстрации

Схема процесса:

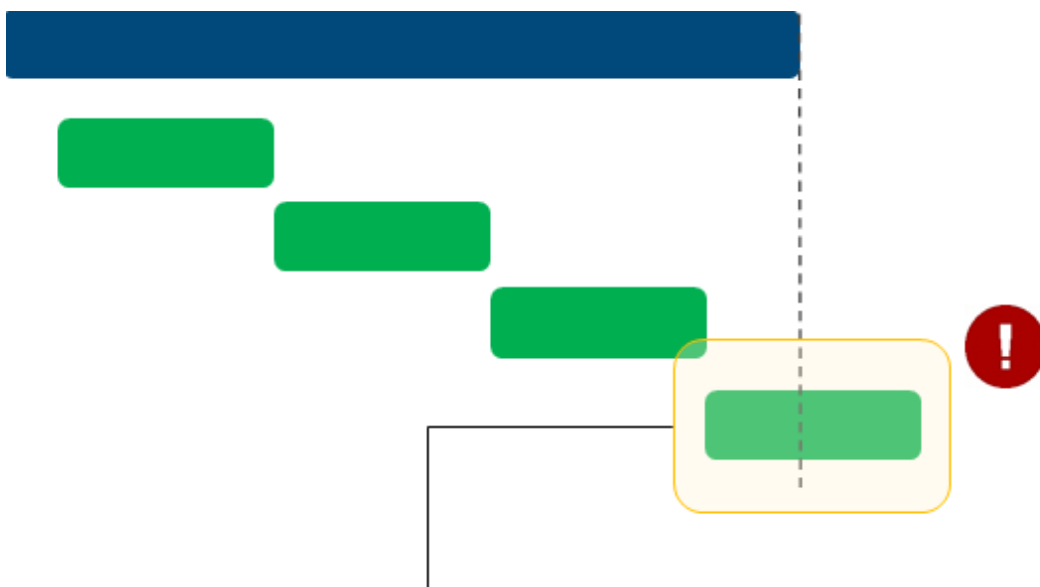

Если в процессе планирования сроков реализации задач, плановые сроки устанавливает сам Исполнитель – может возникнуть ситуация, когда срок завершения задачи **выйдет за пределы утвержденных сроков** реализации проекта (этапа)

Данное решение позволяет исключить такие ситуации

Описание процесса:

1. Пользователь изменяет срок завершения задачи, в период после завершения проекта.
2. Система уведомляет об этом РП и автоматически создает запрос на изменение сроков.
3. Руководитель проекта рассматривает запрос и принимает решение о переносе сроков.
4. В случае положительного решения – РП изменяет сроки завершения проекта. В случае отрицательного решения – исполнитель изменяет сроки завершения задачи.

Проверка документов

Системный Администратор / Руководитель | Воронев Олег / Исполнитель

Статус: 0% | Начало: 01.06.2023 9:00 | Завершение: 22.06.2023 17:00

Уведомления об автособытиях: Новая плановая дата завершения задачи АП-12 10 КТ раздел 2 Отдел 6 превышает плановую дату завершения родительского объекта АП-12 10 КТ Стадия П Отдел 6.

Запрос на перенос сроков

Текущая дата завершения	Утвержденная дата завершения	Запрос на перенос сроков	Причина переноса срока
23.10.2023		<input checked="" type="checkbox"/>	Задача 2.1

Дата	Автор	Предлагаемая дата переноса	Причина переноса срока
16.08.2023	Воронев Олег	25.08.2023	тест1
08.08.2023	Воронев Олег	01.08.2023	выходит за границы
08.08.2023	Воронев Олег	07.06.2023	дата внутри
07.08.2023	Воронев Олег	07.06.2023	Новая дата не выходит за рамки

Обратная связь

Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA
Хочу так же

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/prohibition_planned_dates

Last update: 16.01.2026 14:00

