

# Содержание

<b>Проблемы</b> .....	3
<b>Выгоды</b> .....	3
<b>Назначение</b> .....	3
<b>Компоненты решения</b> .....	3
<b>Автоматизируемые функции и процессы</b> .....	3
<b>Описание и иллюстрации</b> .....	3



# F05 Сохранение базового плана по стоимости проекта (бюджет проекта)

Финансовый контур, через тсл

## Проблемы

1. Отсутствие базового плана по стоимости проекта.
2. Нет возможности контролировать плановые и фактические расходы по проекту в сопоставлении с утвержденным бюджетом.
3. Расходование денег на проекты превышает ожидания.

## Выгоды

1. Контроль стоимости выполнения проектов.

## Назначение

1. Сохранение базового плана по стоимости.

## Компоненты решения

- настройки ИСУП: объекты, справочники, отчёты;
- триггер.

## Автоматизируемые функции и процессы

- Определение бюджета


## Описание и иллюстрации

**Шаг 1.** Руководитель проекта формирует новую версию бюджета и отправляет ее на согласование (Формирование и отправка бюджета на согласование подробно описано в решении [F04 Формирование и отправка на согласование бюджета проекта](#))


**Шаг 2.** Сохранение базового плана по стоимости проекта происходит после успешного согласования бюджета проекта



Триггер фиксирует ранее отправленный на согласование бюджет проекта как утвержденный и записывает его в специальный справочник - «Утвержденный бюджет».

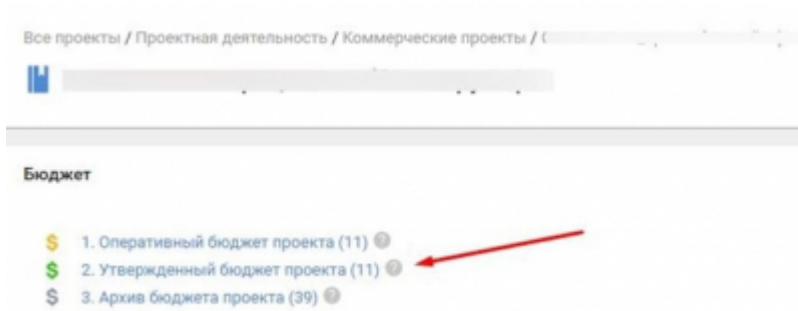

После сохранения базовой стоимости проекта просмотр утвержденного бюджета в консолидированном виде возможен через специально настроенный отчет «Утвержденный бюджет проекта».



Бюджет проекта

Страница 1 из 1

Страница 1 из 1

Код услуги	Наименование услуги	Статья затрат	Исполнитель	Проводитель	Цена за ед. усл.	Часы/Количество	Субсоставность (руб.)	Субсоставность (Б.С.)
<b>Этап 1 ТМВ. Проектирование</b>								
802963	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ		Т/С	3 891,00	30	118 730,00	118 730,00
802969	ИТ 3 уровень	ФОТ		Т/С	2 421,00	94	345 384,00	345 384,00
802178	Расход затрат на материалы (-) - % от стоимости работ (этап)	Ремонт		Р/М	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
872542	Проектирование	Поддержка		ОС	1 980 000,00	1	1 980 000,00	2 033 262,00
802178	Унифицированный комплект			ИИ	1,00	1	1,00	1,00
<b>Этап 2 Интеграция Систем</b>								
<b>интеграция офисных пространств</b>								
<b>Минской SmartOffice с интеграцией корпоративной платформы TM Live</b>								
802969	ИТ 3 уровень	ФОТ		Т/С	2 421,00	120	314 520,00	314 520,00
802963	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ		Т/С	3 891,00	60	233 460,00	233 460,00
802963	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ		Т/С	3 891,00	20	77 820,00	77 820,00
802178	Расход затрат на материалы (-) - % от стоимости работ (этап)	Ремонт		Р/М	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
872534	Интеграция Систем управления офисными пространствами с платформой корпоративной платформы	Поддержка		ОС	6 371 960,00	1	6 372 960,00	6 544 392,62
802178	Унифицированный комплект			ИИ	1,00	1	1,00	1,00
<b>Итого:</b>							<b>9 887 216,00</b>	<b>10 892 004,62</b>

**Шаг 3.** Дополнительно система сохраняет ранее утвержденный бюджет как версию (Сохранение версии бюджета подробно описано в решении [F06 Версионность бюджета проекта](#)).

**Если Вам интересно подробнее узнать о возможностях платформы и решений на базе ADVANTA,**

**то Вы можете связаться с нами:**

[Запросить демоверсию](#)

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: [https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects\\_and\\_tasks/planning/project\\_budget?rev=1764106443](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/project_budget?rev=1764106443)

Last update: 25.11.2025 21:34

