

## Содержание

<b>Проблемы</b> .....	3
<b>Выгоды</b> .....	3
<b>Назначение</b> .....	3
<b>Компоненты решения</b> .....	3
<b>Автоматизируемые функции и процессы</b> .....	3
<b>Описание и иллюстрации</b> .....	3



# F05 Сохранение базового плана по стоимости проекта (бюджет проекта)

Финансовый контур, через тсл

## Проблемы

1. Отсутствие базового плана по стоимости проекта.
2. Нет возможности контролировать плановые и фактические расходы по проекту в сопоставлении с утвержденным бюджетом.
3. Расходование денег на проекты превышает ожидания.

## Выгоды

1. Контроль стоимости выполнения проектов.

## Назначение

1. Сохранение базового плана по стоимости.

## Компоненты решения

- настройки ИСУП: объекты, справочники, отчёты;
- триггер.


## Автоматизируемые функции и процессы

- Определение бюджета


## Описание и иллюстрации

**Шаг 1.** Руководитель проекта формирует новую версию бюджета и отправляет ее на согласование (Формирование и отправка бюджета на согласование подробно описано в решении [F04 Формирование и отправка на согласование бюджета проекта](#))


**Шаг 2.** Сохранение базового плана по стоимости проекта происходит после успешного согласования бюджета проекта



Триггер фиксирует ранее отправленный на согласование бюджет проекта как утвержденный и записывает его в специальный справочник - «Утвержденный бюджет».

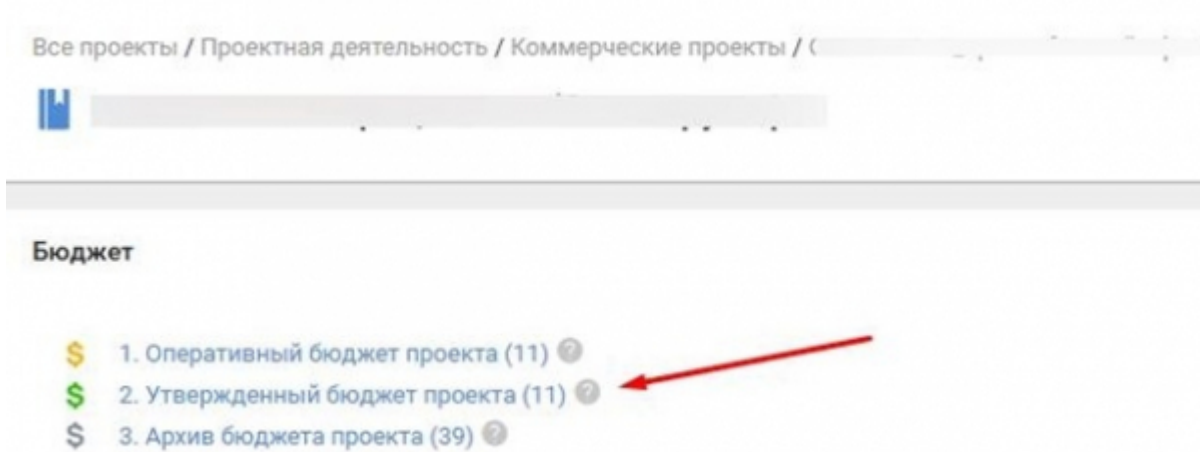

После сохранения базовой стоимости проекта просмотр утвержденного бюджета в консолидированном виде возможен через специально настроенный отчет «Утвержденный бюджет проекта».

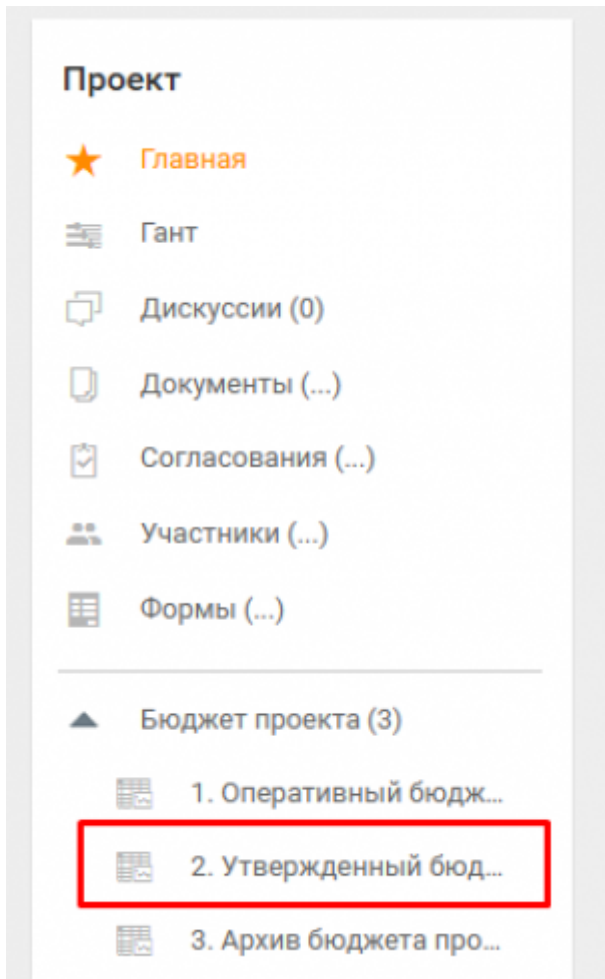

бюджет проекта ⌵ Открыть фильтр ⚙ Открыть панель инструментов

Код услуги	Наименование услуги	Статья затрат	Исполнитель	Производитель	Цена за ед., руб.	Часы/Количество	Себестоимость, руб.	Себестоимость (LC)
<b>Этап 1 TNL Проектирование</b>								
805963	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ		Пл	3 892,00	30	116 760,00	116 760,00
805998	РП 3 уровень	ФОТ		Пл	2 622,00	54	141 588,00	141 588,00
881116	Риски этапа проектирования (~ 7% от стоимости работ этапа)	Риски		Рис	330 000,00	1	330 000,00	330 000,00
872542	Проектирование	Подрядчики		OC	1 980 000,00	1	1 980 000,00	2 033 262,00
881115	Идентификатор комплекта			SE	1,00	1	1,00	1,00
<b>Этап 2 Интеграция Системы управления офисным пространством Microsoft SmartOffice с приложением корпоративной платформы TN Life</b>								
805998	РП 3 уровень	ФОТ		Пл	2 622,00	120	314 640,00	314 640,00
805963	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ		Пл	3 892,00	60	233 520,00	233 520,00
805963	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ		Пл	3 892,00	20	77 840,00	77 840,00
881117	Риски этапа интеграции (~ 7% от стоимости работ этапа)	Риски		Рис	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
872534	Интеграция Системы управления офисным пространством с приложением корпоративной платформы	Подрядчики		OC	6 372 960,00	1	6 372 960,00	6 544 392,62
881118	Идентификатор комплекта			SE	1,00	1	1,00	1,00
<b>ИТОГО</b>							<b>9 867 310,00</b>	<b>10 092 804,62</b>

**Шаг 3.** Дополнительно система сохраняет ранее утвержденный бюджет как версию (Сохранение версии бюджета подробно описано в решении [F06 Версионность бюджета проекта](#)).

**Если Вам интересно подробнее узнать о возможностях платформы и решений на базе ADVANTA,  
то Вы можете связаться с нами:  
[Запросить демоверсию](#)**

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects\\_and\\_tasks/planning/project\\_budget?rev=1764106457](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/project_budget?rev=1764106457)

Last update: **25.11.2025 21:34**

