


# Содержание




# Отклонение от базового плана

Вы можете как сравнить базовый план с оперативным, так и сравнивать базовые планы разных периодов между собой.

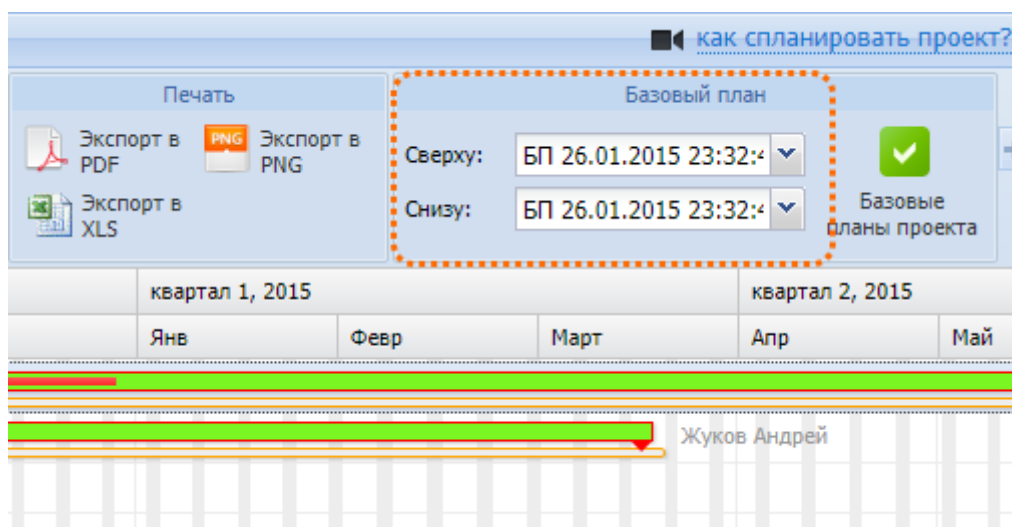

Наглядно базовый план отображается в диаграмме Ганта. Здесь вы можете:

1. вывести базовый план в графическую часть диаграммы и сравнить «полоски» задач между собой;

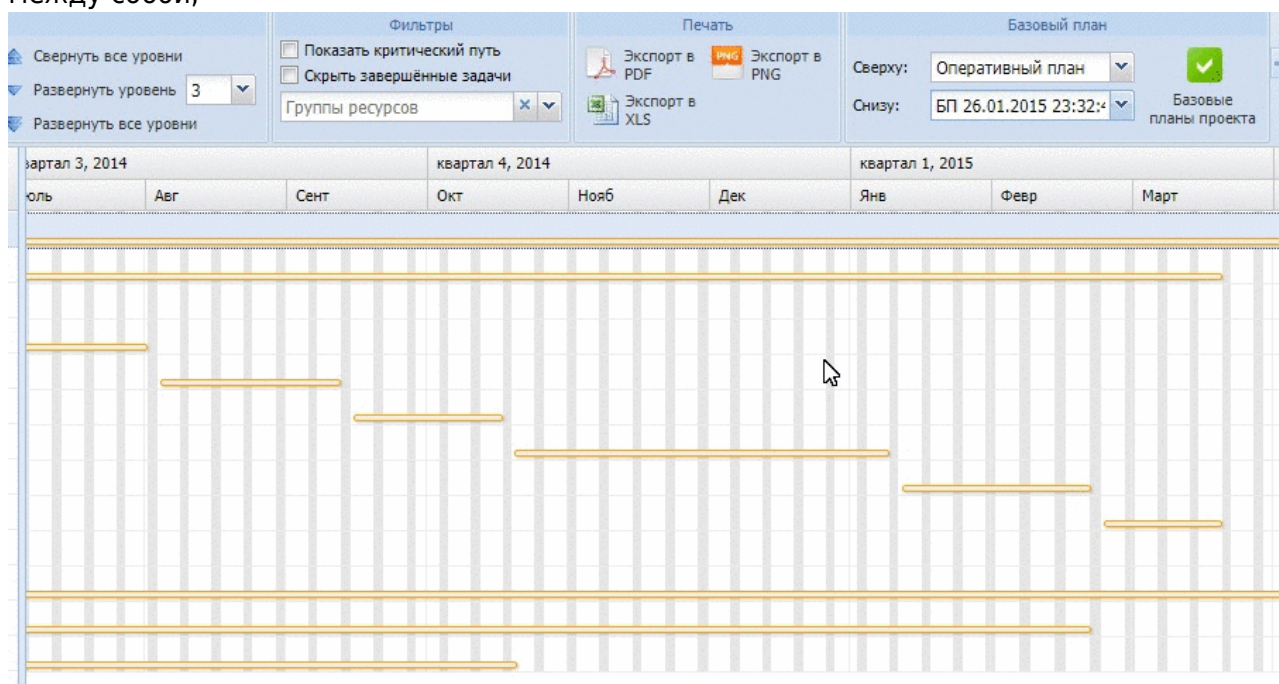

2. вывести все даты всех БП в табличную часть.

Название	Статус	Матрица	Окончание	Длительно...	% выпол...	Исполнитель	Ресурс	Трудоз
Найти...	↑ ↓	Сортировать по возрастанию	13.06.2015	263 дней	55	Фильтр	Фильтр	1114 ч
Комплексное переосна...	↓ ↑	Сортировать по убыванию	20.03.2015	201 дней	56	Жуков Андрей		1098 ч
План проекта		Удалить сортировку	20.06.2014	6 дней	100	Жуков Андрей		17 час
Инициация прое...		Столбцы	01.08.2014	30 дней	99	Жуков Андрей		64 час
Разработка ТЗ	В работе		12.09.2014	30 дней	100	Жуков Андрей		120 ча
Разработка прое...	Завершён		17.10.2014	25 дней	2	Жуков Андрей		232 ча
Поставка оборуд...	В работе		09.01.2015	60 дней	0	Жуков Андрей		216 ча
Выполнение СМР	Не начат		20.02.2015	30 дней	100	Жуков Андрей		281 ча
ПНР	Не начат		20.03.2015	20 дней	77	Жуков Андрей		168 ча
Запуск объекта	В работе		13.06.2014	13.06.2014	1 день	Ковалева Светлана		
Совещания проекта	В работе		11.06.2014	13.06.2015	263 дней	Иванова Анна		
Поручения	В работе		20.02.2015	183 дней	0	Ковалева Светлана		
Контракты с заказчи	В работе		20.10.2014	92 дней	0	Ковалева Светлана		16 час
Контракты с подряд	Не начат							

В графической части есть ограничение: одновременно можно вывести только два плана, причём неважно каких (базовый(ые), оперативный или факт-прогноз)

[Назад](#)

[Вперёд](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/users/project/6\\_2](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/users/project/6_2)

Last update: **13.07.2022 10:12**

