


Содержание


Отклонение от базового плана

Вы можете как сравнить базовый план с оперативным, так и сравнивать базовые планы разных периодов между собой.

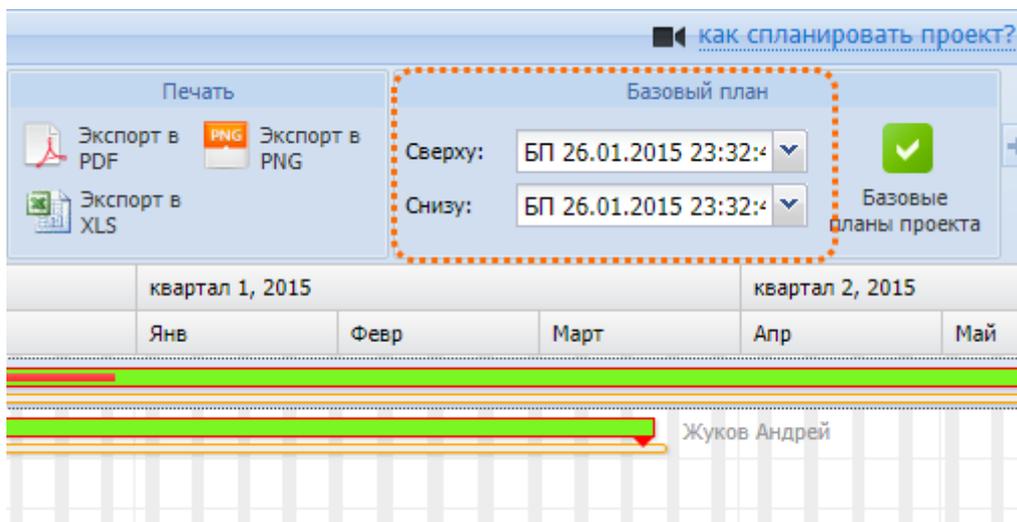

Наглядно базовый план отображается в диаграмме Ганта. Здесь вы можете:

1. вывести базовый план в графическую часть диаграммы и сравнить «полоски» задач между собой;

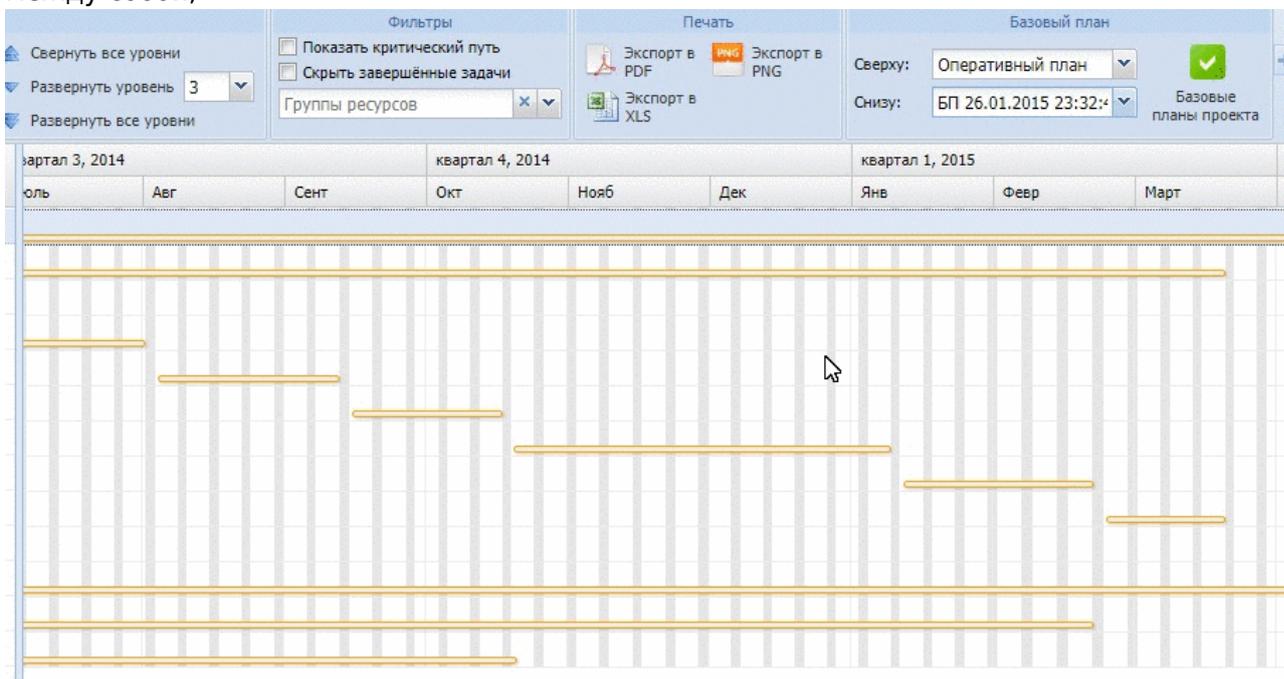

2. вывести все даты всех БП в табличную часть.

Название	Статус	Исполнитель	Окончание	Длительно...	% выпол...	Исполнитель	Ресурс	Трудоз...
Найти...	↑	Фильтр				Фильтр		
Комплексное переосна...	↓		13.06.2015	263 дней	55	Ковалева Светлана		1114 ч
План проекта	Удалить сортировку		20.03.2015	201 дней	56	Жуков Андрей		1098 ч
Инициация прое...	Столбцы		20.06.2014	6 дней	100	Жуков Андрей		17 час
Разработка ТЗ			01.08.2014	30 дней	99	Жуков Андрей		64 час
Разработка прое...	Завершён		04.08.2014	12.09.2014	30 дней	100	Жуков Андрей	120 ча
Поставка оборуд...	В работе		15.09.2014	17.10.2014	25 дней	2	Жуков Андрей	232 ча
Выполнение СМР	Не начат		20.10.2014	09.01.2015	60 дней	0	Жуков Андрей	216 ча
ПНР	Не начат		12.01.2015	20.02.2015	30 дней	100	Жуков Андрей	281 ча
Запуск объекта	В работе		23.02.2015	20.03.2015	20 дней	77	Жуков Андрей	168 ча
Совещания проекта	В работе		13.06.2014	13.06.2014	1 день	100	Ковалева Светлана	
Поручения	В работе		11.06.2014	13.06.2015	263 дней	78	Иванова Анна	
Контракты с заказчи	В работе		11.06.2014	20.02.2015	183 дней	0	Ковалева Светлана	
Контракты с подряд	Не начат		13.06.2014	20.10.2014	92 дней	0	Ковалева Светлана	16 час

В графической части есть ограничение: одновременно можно вывести только два плана, причём неважно каких (базовый(ые), оперативный или факт-прогноз)

[Назад](#)
[Вперёд](#)

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/users/project/6_2

Last update: **13.07.2022 10:12**

