


# Содержание




# Отклонение от базового плана

Вы можете как сравнить базовый план с оперативным, так и сравнивать базовые планы разных периодов между собой.

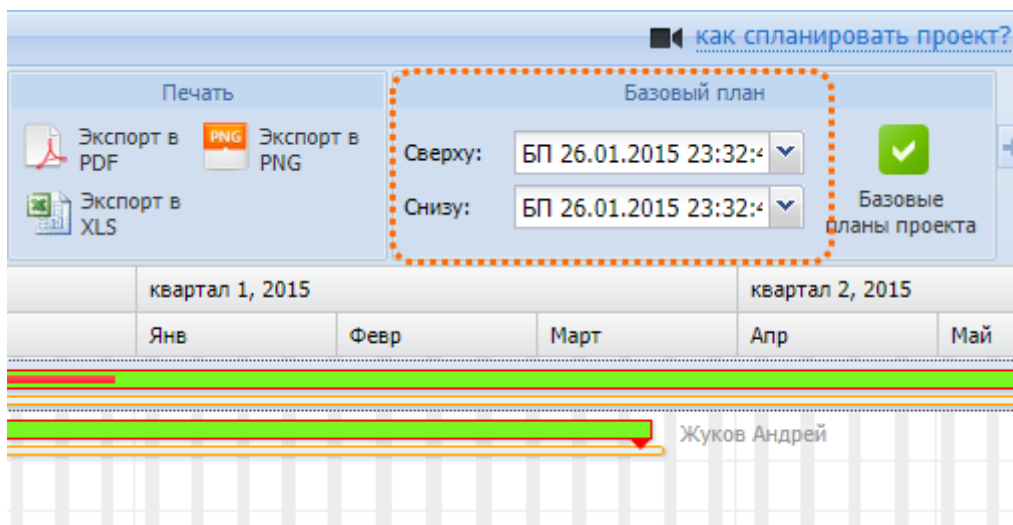

Наглядно базовый план отображается в диаграмме Ганта. Здесь вы можете:

1. вывести базовый план в графическую часть диаграммы и сравнить «колбаски» задач между собой;

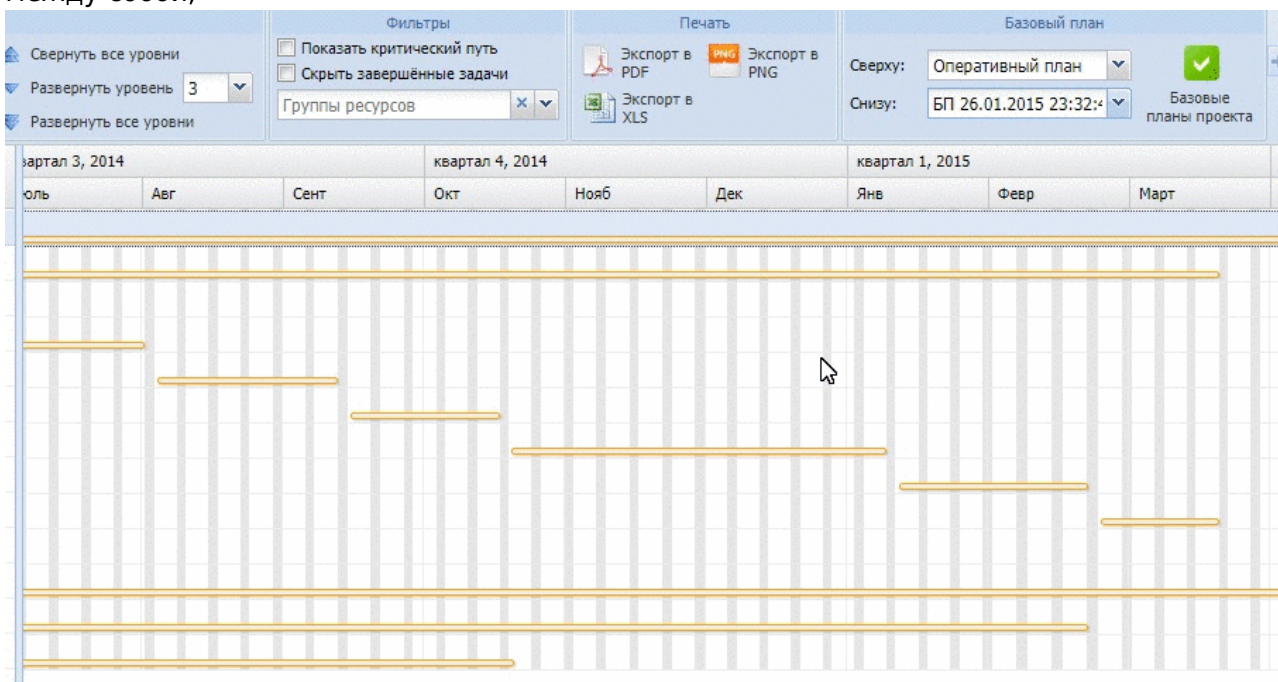

2. вывести все даты всех БП в табличную часть.

Название	Статус	Начало	Окончание	Длительно...	% выпол...	Исполнитель	Ресурс	Трудоз...
Найти...	↑					Фильтр	Фильтр	
Комплексное переосна...	↓		13.06.2015	263 дней	55	Ковалева Светлана		1114 ч
План проекта	Удалить сортировку		20.03.2015	201 дней	56	Жуков Андрей		1098 ч
Инициация прое...	Столбцы		20.06.2014	6 дней	100	Жуков Андрей		17 час
Разработка ТЗ		23.06.2014	01.08.2014	30 дней	99	Жуков Андрей		64 час
Разработка прое...	Завершён	04.08.2014	12.09.2014	30 дней	100	Жуков Андрей		120 ча
Поставка оборуд...	В работе	15.09.2014	17.10.2014	25 дней	2	Жуков Андрей		232 ча
Выполнение СМР	Не начат	20.10.2014	09.01.2015	60 дней	0	Жуков Андрей		216 ча
ПНР	Не начат	12.01.2015	20.02.2015	30 дней	100	Жуков Андрей		281 ча
Запуск объекта	В работе	23.02.2015	20.03.2015	20 дней	77	Жуков Андрей		168 ча
Совещания проекта	В работе	13.06.2014	13.06.2014	1 день	100	Ковалева Светлана		
Поручения	В работе	11.06.2014	13.06.2015	263 дней	78	Иванова Анна		
Контракты с заказчи	В работе	11.06.2014	20.02.2015	183 дней	0	Ковалева Светлана		
Контракты с подряд	Не начат	13.06.2014	20.10.2014	92 дней	0	Ковалева Светлана		16 час

В графической части есть ограничение: одновременно можно вывести только два плана, причём неважно каких (базовый(ые), оперативный или факт-прогноз)

[Назад](#)  
[Вперёд](#)

From:  
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/users/project/6\\_2?rev=1562325690](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/users/project/6_2?rev=1562325690)

Last update: **05.07.2019 11:21**

