

Содержание

Проблемы

Выгоды

Назначение

Компоненты решения

Автоматизируемые функции и процессы

Описания и иллюстрации

Обратная связь

3

3

3

3

3

3

5

В13 Блокировка плана-графика от изменений пользователями, имеющими к нему доступ

БП, через тсл

Проблемы

1. Сотрудники рабочей группы проекта для планирования проекта имеют права на редактирование плана-графика. Согласование плана-графика на несколько тыс. строк идет от 2 до 4 недель, права на редактирование у рабочей группы сохраняются и концептуально они могут менять этот план-график в Системе, пока идет согласование.
2. Поддержание графика в неизменном состоянии во время его согласования требует от проектного офиса значительных временных затрат
3. Завершенный проект доступен для редактирования командой до тех пор, пока он не будет перемещён в раздел «Архив проектов».

Выгоды

1. Сокращение времени ПРОФ на контроль проектов.
2. Получение ресурса на обучение / проработку новых методологических фич для компании.

Назначение

Автоматизировать установку запрета на изменение плана-графика проекта по нажатию кнопки в карточке проекта.

Компоненты решения

- Настройки ИСУП
- Триггеры

Автоматизируемые функции и процессы

Разработка расписания

Описания и иллюстрации


Кейс: запретить любые изменения в план-графике проекта в следующих случаях:

1. согласование/пересогласования базового план-графика проекта;
2. согласование запроса на изменение параметров проекта;
3. закрытия доступа к проекту после его завершения.

1) Сотрудник проектного офиса на период, когда необходимо заблокировать доступ к редактированию графика проекта со стороны команды (руководителю проекта, куратору, исполнителям/руководителям по задачам) в специально-созданном справочнике карточки проекта создает запись и в реквизите «Заблокировать план-график от изменений исполнителями?» выбирает значение «Заблокировать».

The screenshot displays a project management dashboard. On the left, a sidebar contains sections for 'Project Overview' (including completion status, start/end dates, budget, and potential risk), 'Project Lifecycle' (with phases like 'Preparation' and 'Implementation'), and 'Project Details' (with fields for link, identifier, number, status, goal, and description). The main area shows a 'Ban on editing the project plan by executors' dialog box. This dialog has a 'Add' button, a list of 'Cancelled records' with 'Delete' and 'Execute' buttons, and a table for recording bans. The table has columns for 'Priority', 'Status of object', 'Planned start date', and 'Planned end date'. Below the dialog, a table lists project items: 'Project plan', 'Project risks', 'Open project questions', and 'Project documents'. The 'Project plan' item is highlighted with a 'В РАБОТЕ' status and dates 01.10.2021 to 12.07.2023. The 'Project risks' and 'Open project questions' items have a 'НЕ НАЧАТ' status and the same dates. The 'Project documents' item is also listed.

2) Система (триггер) забирает права доступа у пользователей (ограничиваются следующие действия: изменения реквизитов, статусов, дат объектов, списание фактических трудозатрат, создание новых задач и т.д.). Карточка проекта, график доступны только для просмотра.

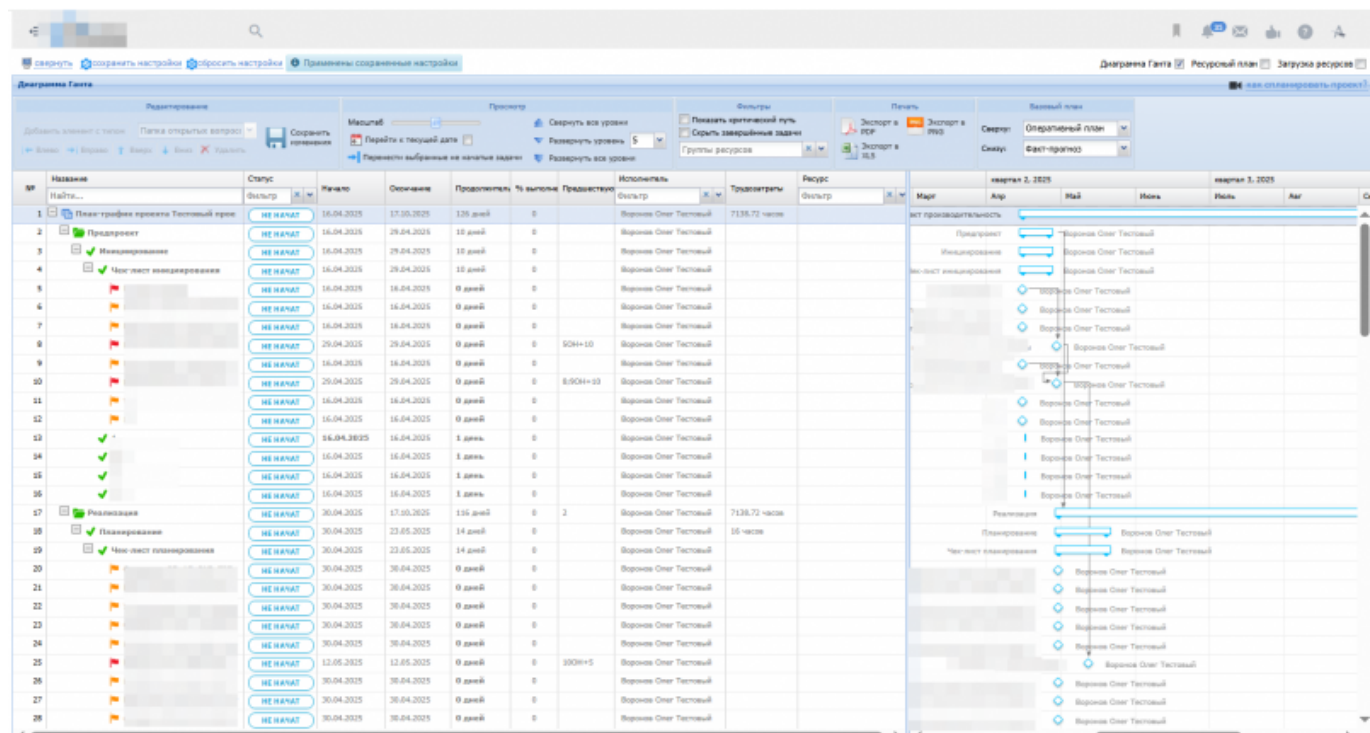

Обратная связь

****Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA****

Хочу так же

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/ban_on_editing

Last update: 25.11.2025 20:19

