

# Содержание

- Проблемы** ..... 3
- Выгоды** ..... 3
- Назначение** ..... 3
- Компоненты решения** ..... 3
- Автоматизируемые функции и процессы** ..... 3
- Особенности** ..... 3
- Описание решения и иллюстрации** ..... 4
  - Обратная связь ..... 5



# R06 Расчет доступной мощности

Ресурсный контур, через тсл

## Проблемы

- Из коробки в Адванте нет возможности указать прогнозное количество рабочих часов сотрудников;
- Из коробки в Адванте нет возможности оперативно указать периоды отсутствия сотрудников: отпуска, больничные, отгулы.

## Выгоды

- Настройка позволяет с помощью отчетов оперативно оценить доступность сотрудников на требуемый период и при необходимости добавить дополнительных исполнителей на задачи.
- Настройка позволяет с помощью отчетов оперативно оценить недозагруженность сотрудников и выдать им дополнительную нагрузку.

## Назначение

- Предоставление инструментов для добавления доступной мощности сотрудников и их периодов недоступности;
- Предоставление отчетности для контроля загрузки сотрудников.

## Компоненты решения

- Настройка ИСУП.

## Автоматизируемые функции и процессы


- Расчет загрузки сотрудников на основании их доступной мощности, плановых трудозатрат и периодов недоступности.

## Особенности


- Система содержит информацию о доступных трудочасах сотрудников и инструменты для планирования загрузки сотрудников.

## Описание решения и иллюстрации

- В иерархическую структуру добавляются объекты типа «Доступная мощность». С их помощью в системе указываются доступные часы сотрудников на год с учетом выбранного календаря.



- В иерархическую структуру добавляются объекты типа «Периоды недоступности». С их помощью в системе указываются отпуска, больничные и отгулы сотрудников.

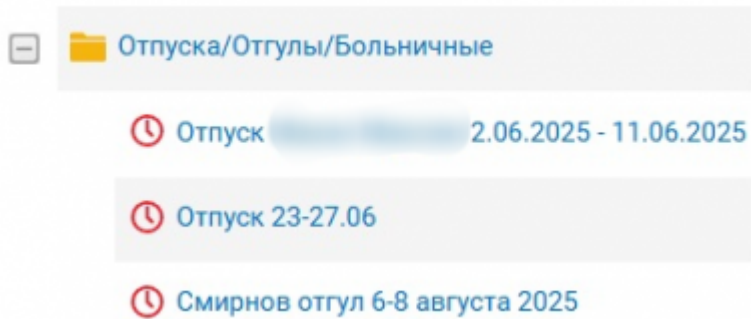

- В диаграмме Ганта указывается плановая загрузка сотрудников по задачам.

Задача	Статус	Начало	Конец	Длительность	Доступные часы	Назначено часов	Резерв часов
...	В РАБОТЕ	06.10.2025	27.04.2026	136 дней	680 часов	...	...
...	ЗАВЕРШЕН	06.10.2025	17.10.2025	10 дней	80 часов	...	...
...	ЗАВЕРШЕН	01.11.2025	01.12.2025	20 дней	80 часов	3	...
...	В РАБОТЕ	06.02.2026	16.03.2026	25 дней	100 часов	5	...
...	В РАБОТЕ	02.12.2025	29.12.2025	20 дней	80 часов	4	...
...	НЕ НАЧАТ	10.03.2026	30.03.2026	15 дней	60 часов	6	...
...	В РАБОТЕ	10.03.2026	30.03.2026	15 дней	60 часов	6	...
...	НЕ НАЧАТ	10.03.2026	06.04.2026	20 дней	60 часов	6	...
...	НЕ НАЧАТ	07.04.2026	27.04.2026	15 дней	60 часов	15	...
...	НЕ НАЧАТ	06.10.2025	22.12.2025	55 дней	100 часов	...	...

- На основании введенных данных формируется OLAP-отчет «Доступная мощность» с помощью которого оценивается загруженность сотрудников.

Доступная мощность

Вывести список скрытых колонок Добавить диаграмму Показывать по 25 строк вид по столбцам в виде иерархии

Дата (месяц год) Дата

Заголовки полей данных Дата (год) Дата (месяц)

Ресурс Список проектов

Ресурс	Октябрь			Ноябрь			Декабрь			Итого: 2025		
	Доступные, ч.	Назначено, ч.	Резерв, ч.	Доступные, ч.	Назначено, ч.	Резерв, ч.	Доступные, ч.	Назначено, ч.	Резерв, ч.	Доступные, ч.	Назначено, ч.	Резерв, ч.
...	184	0	184	152	152	0	176	8	168	512	160	152
...	184	0	184	152	0	152	176	0	176	512	0	512
...	184	0	184	152	0	152	176	0	176	512	0	512
...	184	0	184	152	0	152	176	61	115	512	61	451
...	184	0	184	152	0	152	176	0	176	512	0	512
...	184	0	184	152	0	152	176	0	176	512	0	512
...	184	0	184	152	0	152	176	0	176	512	0	512
...	184	0	184	152	0	152	176	0	176	512	0	512
...	184	0	184	152	0	152	176	0	176	512	0	512
Итого	2 024	240	1 784	1 552	228	1 324	1 808	153	1 655	5 464	621	4 843

## Обратная связь

**\*\*Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA\*\***

[Хочу так же](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/resource\\_management/planning/available\\_power?rev=1763035003](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/resource_management/planning/available_power?rev=1763035003)

Last update: **13.11.2025 11:56**

