

Содержание

- Типы фиксированных ограничений** 3
 - Для планируемой даты начала 3
 - Для планируемой даты окончания 3
- Где в интерфейсе** 4
 - На карточке объекта 4
 - В списке задач 4

Плановые даты. Фиксированные ограничения

Фиксированные ограничения – это те плановые даты, которые пользователь вносит в систему **вручную**.

В диаграмме Ганта все зафиксированные значения отображаются **жирным шрифтом**.

[Подробнее обо всех типах дат системе.](#)

Типы фиксированных ограничений

По умолчанию при создании проекта/задачи плановая дата начала указана с жестким ограничением «Начать».

Продолжительность по умолчанию:

- для [объектов типа проект и директория](#) – 0 дней;
- для задачи – [в соответствии с настройками объекта](#).

Для планируемой даты начала

| Тип | Название | Описание | Ограничения и особенности |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гибкое | Как можно раньше | Планируется на как можно более раннюю дату. | С этим ограничением невозможно задать планируемую дату начала задачи. Планируемую дату окончания задачи задавать также не следует. |
| | Как можно позже | Планируется на как можно более позднее время, но не позднее окончания проекта и без задержки последующих задач. | |
| Полужесткое | Начать не раньше | Когда необходимо, чтобы задача не начиналась ранее определенной даты. | |
| | Начать не позже | Когда необходимо, чтобы задача не начиналась после определенной даты. | |
| Жесткое | Начать | Начало задачи планируется на определенную дату. | |

Для планируемой даты окончания


| Тип | Название | Описание |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Полужесткое | Закончить не раньше | Когда необходимо, чтобы задача не завершалась ранее определенной даты. |
| | Закончить не позже | Когда необходимо, чтобы задача не заканчивалась после определенной даты. |

| Тип | Название | Описание |
|---------|-----------|----------------------------------------------------|
| Жесткое | Закончить | Окончание задачи планируется на определенную дату. |

Где в интерфейсе

На карточке объекта

Все доступные виды фиксированного ограничения плановой даты – в редактирования карточки объекта:

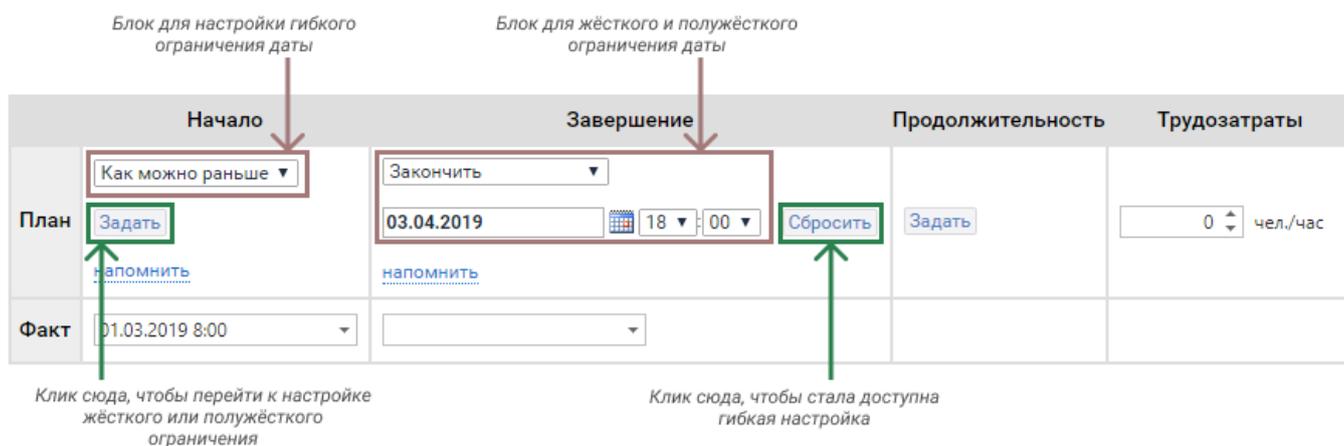

Чтобы изменить даты проекта или задачи:

1. откройте карточку проекта или задачи;
2. зайдите в меню действия (три точки в правом верхнем углу) → «Изменить».

Чтобы **здать гибкое ограничение:**

1. нажмите на «Сбросить» в настройках **даты начала**; *Так вы сбросите жёсткое или полужёсткое ограничение.*
2. выберите из выпадающего списка нужный параметр.

Чтобы **здать жёсткое или полужёсткое ограничение:**

1. нажмите на «Задать»;
2. выберите из выпадающего списка нужный тип ограничения;
3. укажите дату.


В списке задач

Жёсткое и полужёсткое ограничение можно задать в [списках задач](#)¹⁾.


Для этого:

1. переключитесь к представлению списка задач «Таблица»;

2. клик на оранжевую дату;

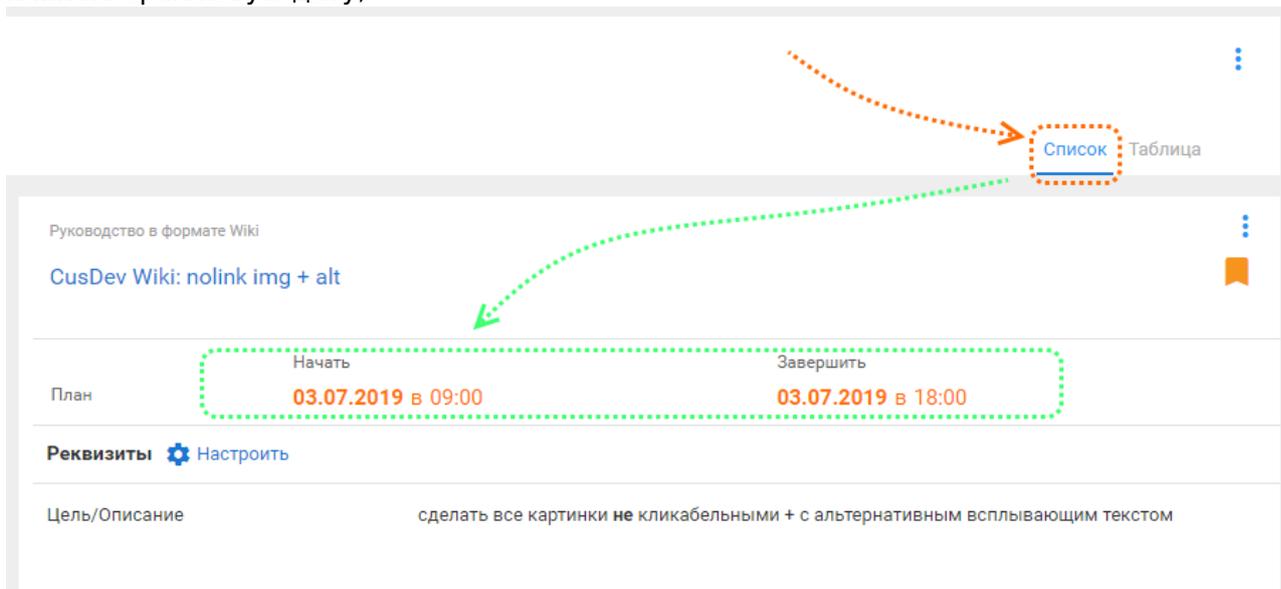

3. отредактируйте ограничения.

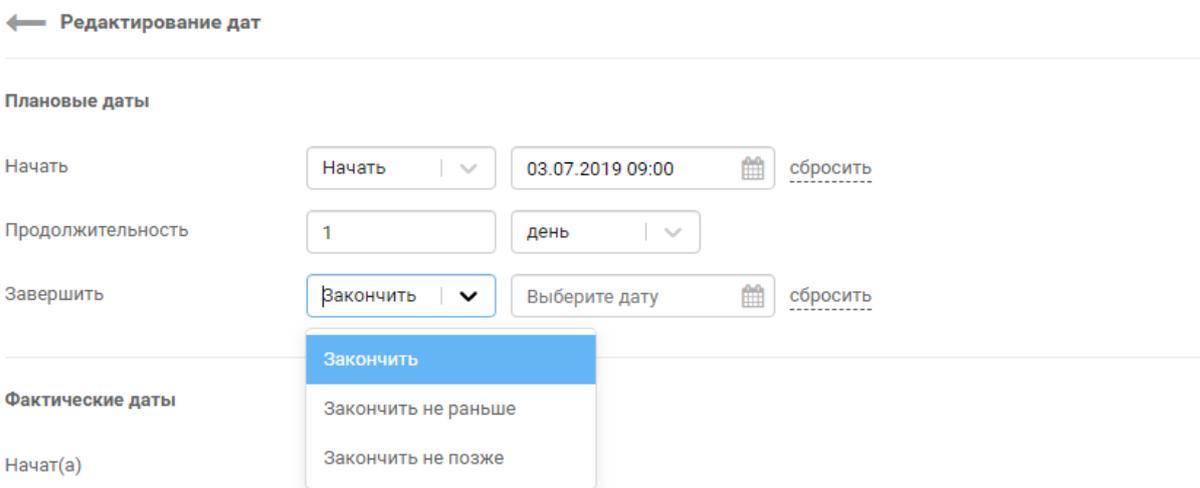

1)

Доступно начиная с версии 3.17

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/date/data_fixed?rev=1562234505

Last update: 04.07.2019 10:01

