Содержание


1. Ставь	те фиксированное ограничение на даты начала проекта и первой задачи
(вехи)	
	льзуйте зависимости 3
	лите в Гант из проекта

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 03.12.2025 11:28

Рекомендации по работе с диаграммой Ганта

Для корректной работы механизма расчета дат крайне рекомендуем придерживаться нескольких правил.

1. Ставьте фиксированное ограничение на даты начала проекта и первой задачи (вехи)



Всегда ставьте фиксированное ограничение для даты начала проекта.

Ставьте фиксированное ограничение на первую задачу или первую веху, от которой начинает выстраиваться дерево зависимостей (связей) между работами проекта.


Сделать это можно:

- на диаграмме Ганта двойной клик на дату → вписать нужную дату;
- на карточке объекта.

Фиксированное ограничение отображается в диаграмме Ганта жирным шрифтом.

Не рекомендуем задавать фиксированных ограничений для узловых задач, позволив системе рассчитывать их самостоятельно. Использование фиксированных дат для узловых задач ограничит гибкость план-графика.

2. Используйте зависимости



Чтобы план-график был гибким, используйте зависимости.


Так вы ограничите продолжительность работ и свяжете их, например, с предшествующими задачами.

Рекомендуем создавать зависимости только между конечными задачами (без дочерних).

Создание зависимостей **от** и/или **к** узловым задачам может приводит к возникновению цикличных связей либо конфликтов дат, что, в свою очередь, приведет к некорректной работе Ганта и некорректному расчету дат.

3. Заходите в Гант из проекта

Чтобы расчёт дат проекта был корректным, всегда заходите в диаграмму Ганта только из уровня проекта (а не из задач, которые в проект вложены и не из директории, куда проект вложен).

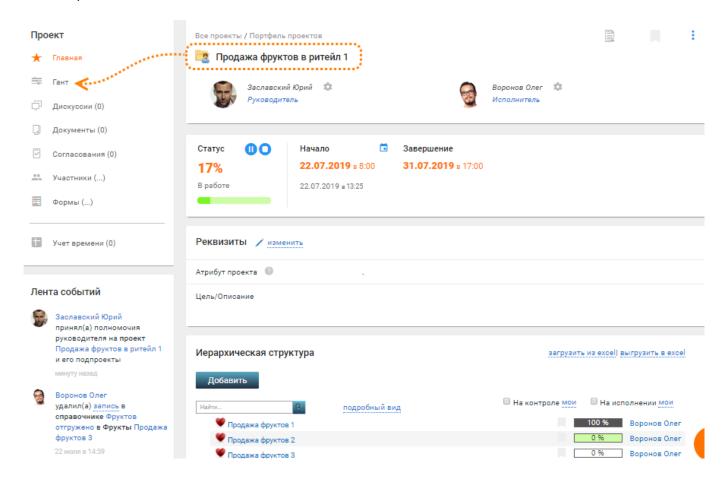

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/gant/recomend?rev=1616582871

Last update: 24.03.2021 10:47



https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 03.12.2025 11:28
