## Содержание

Описание решения	3
Процесс работы в Системе	3

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 17.11.2025 23:38

## Блокировка графика проекта руководителем проекта от его случайных изменений пользователями

## Описание решения

В ADVANTA есть множество отчётов, которые показывают информацию из разных объектов системы для формирования общей картины по состоянию проектов или портфеля проектов. Ошибки при внесении данных, даже допущенные случайно, могут влиять на искажение того или иного показателя в отчётах.

В ADVANTA мы предусмотрели такую ситуацию и сделали решение по блокировке некоторых объектов от внесения изменений.

Такое решение прежде всего помогает снизить вероятность ошибочных действий со стороны пользователей и позволяет сократить время на проверку данных в Системе.


На период согласования и утверждения базового плана необходимо заблокировать планграфик от несанкционированных изменений.

Это может сделать руководитель проекта с помощью переключателя. Конечно, при необходимости можно снять блокировку.


Так пользователи смогут внести необходимые изменения, и все действия будут согласованы.

## Процесс работы в Системе


1. Пользователь создаёт проект, вносит необходимые дочерние объекты.

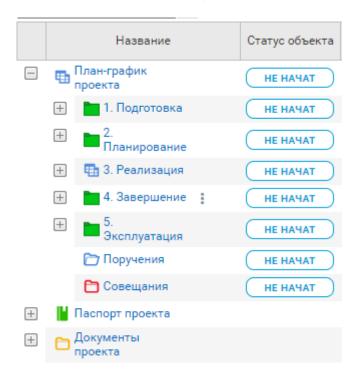

2. По завершении создания проекта автоматически создается запись в справочнике "Блокировка план-графика от изменений исполнителями".



3. Руководитель проекта может вносить или удалять записи в справочнике самостоятельно.



Таким образом, любые изменения план-графика теперь должны согласовываться с руководителем проекта.

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/lib/block

Last update: **06.06.2022 10:21** 



https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 17.11.2025 23:38
