

**Содержание**

В чем польза ..... 3

Демонстрация сценария ..... 3

Как работает ..... 3



# Оценка качества базового плана до утверждения


## В чем польза

Проверка качества базового плана с применением Цифрового помощника помогает сэкономить время руководителя и избежать возможных ошибок в планировании.

## Демонстрация сценария

## Как работает

- Создайте и сохраните в проекте дискуссию с типом «Запрос на утверждение базового плана», при необходимости запросите в обсуждение коллег

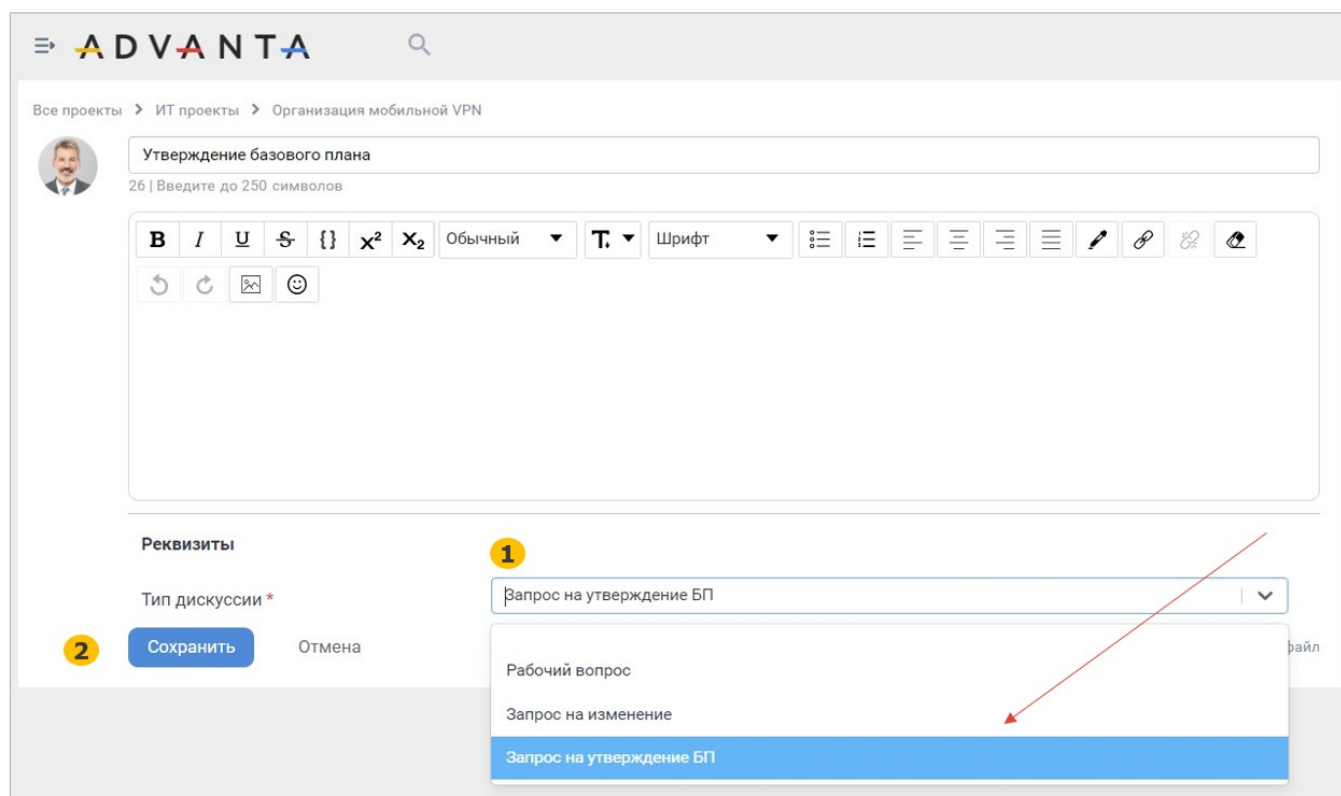

- Цифровой помощник обработает данные по проекту и проверит план по нужным критериям
- В дискуссии автоматически опубликуются результаты проверки, чтобы руководитель проекта и все участники могли ознакомиться с информацией и принять участие в дальнейшем обсуждении. Если утверждение базового плана не рекомендовано, в ответе отразятся причины и замечания, которые следует устранить

≡

ADVANTA

🔍

Все проекты > ИТ проекты > Организация мобильной VPN > Дискуссии

🗨

Утверждение базового плана

< Назад к списку дискуссий

Воронов Олег

30 октября в 13:51

Реквизиты

Тип дискуссии \*

Запрос на утверждение БП

👍 Нравится

📎 Добавить файл

↩ Ответить

✔ Ознакомлен

Цифровой Помощник → 

+

30 октября в 13:51

Запрошено утверждение Базового плана по проекту Организация мобильной VPN, Руководитель проекта Воронов Олег

Дата окончания по ранее утвержденному БП: 15.07.2024, новая предлагаемая дата завершения проекта: 29.07.2024.Предложен перенос даты окончания на 10 рабочих дней.

На ближайший год, от текущей даты, в плане проекта присутствуют Задачи с недостаточной декомпозицией (длительностью более месяца), число таких задач - 2

В проекте присутствуют работы начало которых на текущий момент просрочено, число просроченных - 1

В проекте на ближайший год работ недостаточное число контрольных точек, рекомендуется каждый месяц иметь хотя бы одну КТ

Не рекомендуется утверждение базового плана

👍 Нравится

↩ Ответить

Возможны и другие сценарии работы Цифрового помощника с базовым планом. Например, проверка качества базового плана в ходе согласования Проектным офисом. Проектный офис сохраняет базовый план, Цифровой помощник проверяет его. Если результаты проверки положительные, то проект автоматически переводится в статус «Реализация проекта», а Руководителю проекта направляется соответствующее уведомление.

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link:

[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/plan\\_evaluation](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/plan_evaluation)

Last update:

18.01.2024 07:29
