

Содержание

В чем польза	3
Как работает	3


Оценка качества базового плана до утверждения

В чем польза

Сокращение трудозатрат и повышение качества оценки планов проектов.

Как работает


- В проекте создайте и сохраните дискуссию с типом «Запрос на утверждение базового плана»

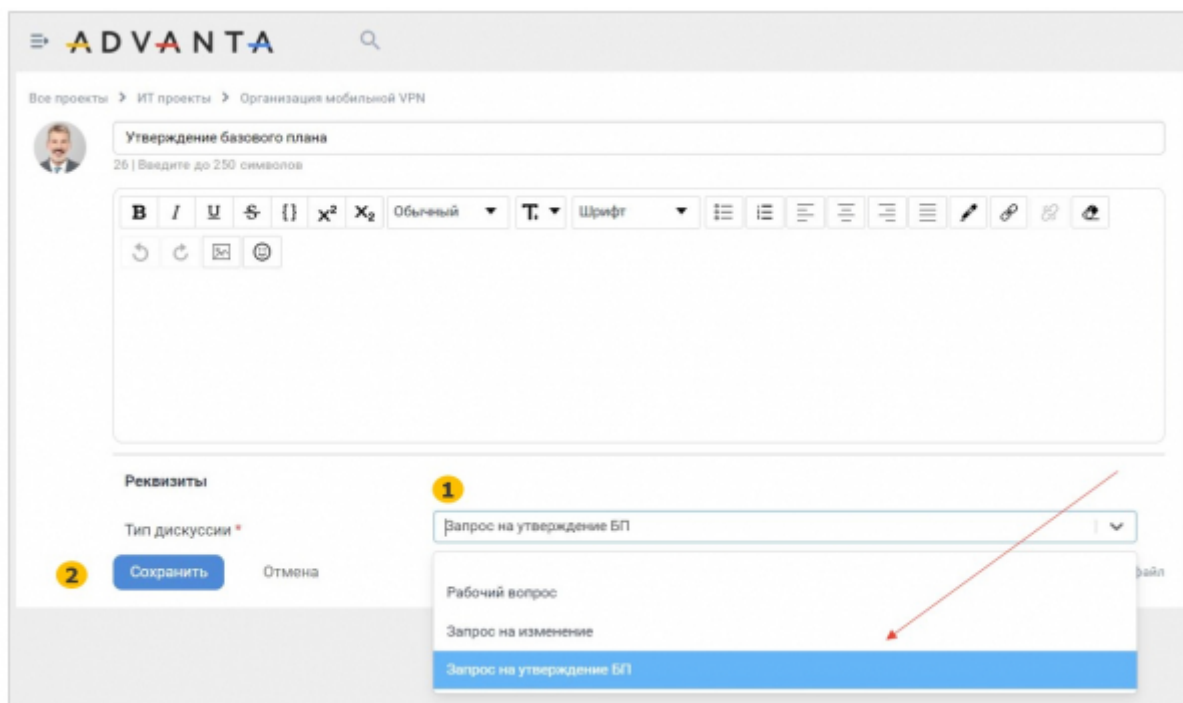

- Цифровой помощник проверит план по нужным критериям
- В дискуссии автоматически опубликуется список проблем и рекомендации по их устранению





Все проекты > ИТ проекты > Организация мобильной VPN > Дискуссии


Утверждение базового плана [Назад к списку дискуссий](#)


 **Воронов Олег** 26 сентября в 16:08

Реквизиты

Тип дискуссии * Запрос на утверждение БП

 Нравится  Добавить файл  Ответить  Ознакомлен

Цифровой Помощник  26 сентября в 16:08

 Запрошено утверждение Базового плана по проекту **Организация мобильной VPN**, Руководитель проекта **Васильев Денис**

Дата окончания по ранее утвержденному БП: **15.07.2024**, новая предлагаемая дата завершения проекта: **29.07.2024**. Предложен перенос даты окончания на **10 рабочих дней**.

На ближайший год, от текущей даты, в плане проекта присутствуют Задачи с недостаточной декомпозицией (длительностью более месяца), число таких задач - 3

В проекте присутствуют работы начало которых на текущий момент просрочено, число просроченных - 2

В проекте на ближайший год работ недостаточное число контрольных точек, рекомендуется каждый месяц иметь хотя бы одну КТ

Не рекомендуется утверждение базового плана

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/plan_evaluation?rev=1698663824

Last update: **30.10.2023 11:03**

