

## Содержание

В чем польза .....	3
Как работает .....	3




# Оценка качества базового плана до утверждения

## В чем польза

Сокращение трудозатрат и повышение качества оценки планов проектов.

## Как работает


- В проекте создайте и сохраните дискуссию с типом «Запрос на утверждение базового плана»

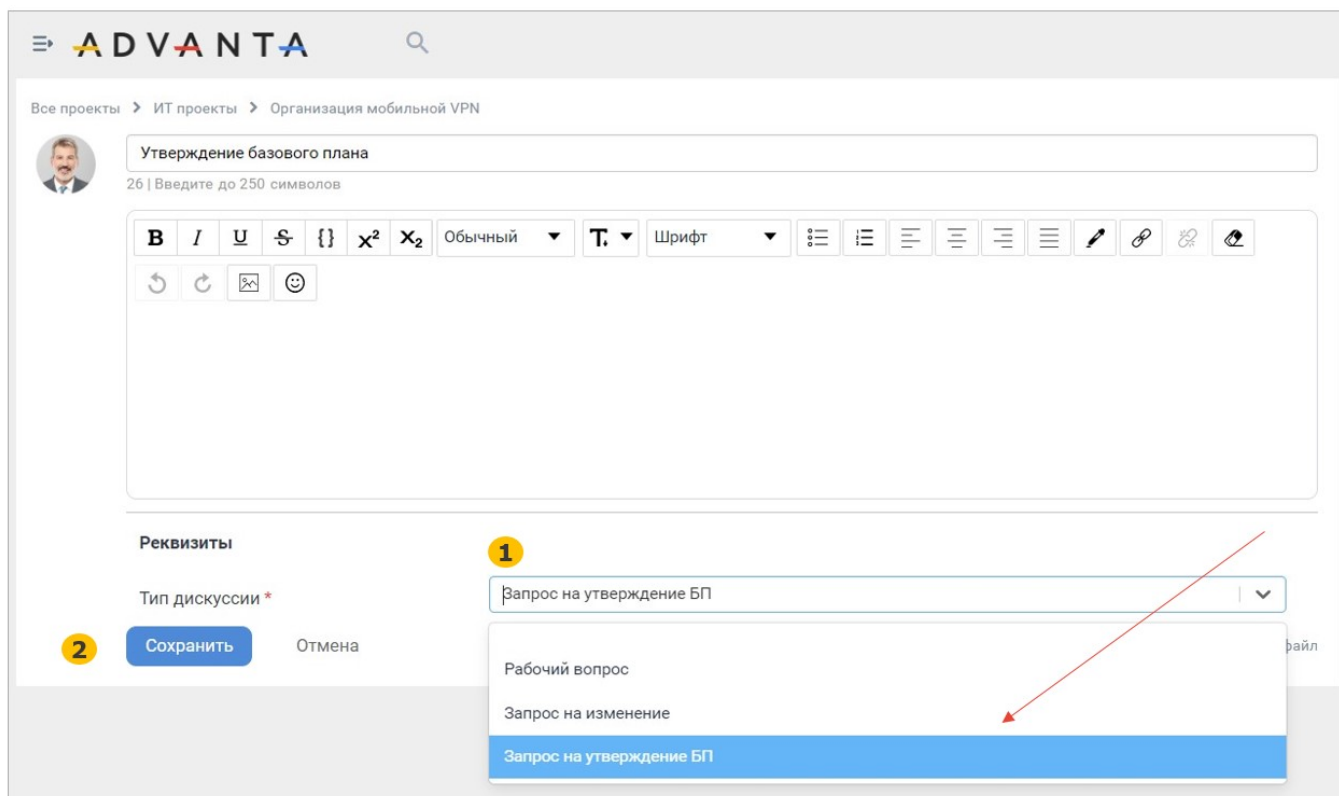

- Цифровой помощник проверит план по нужным критериям
- В дискуссии автоматически опубликуется список проблем и рекомендации по их устранению

Все проекты > ИТ проекты > Организация мобильной VPN > Дискуссии





## Утверждение базового плана [← Назад к списку дискуссий](#)

 **Воронов Олег** 26 сентября в 16:08


---


### Реквизиты

Тип дискуссии \* Запрос на утверждение БП

 Нравится  Добавить файл  Ответить  Ознакомлен

---

**Цифровой Помощник** →  26 сентября в 16:08

 Запрошено утверждение Базового плана по проекту **Организация мобильной VPN**, Руководитель проекта **Васильев Денис**

Дата окончания по ранее утвержденному БП: **15.07.2024**, новая предлагаемая дата завершения проекта: **29.07.2024**. Предложен перенос даты окончания на **10 рабочих дней**.

На ближайший год, от текущей даты, в плане проекта присутствуют Задачи с недостаточной декомпозицией (длительностью более месяца), число таких задач - 3

В проекте присутствуют работы начало которых на текущий момент просрочено, число просроченных - 2

В проекте на ближайший год работ недостаточное число контрольных точек, рекомендуется каждый месяц иметь хотя бы одну КТ

**Не рекомендуется утверждение базового плана**

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: [https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/plan\\_evaluation?rev=1698663855](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/plan_evaluation?rev=1698663855)

Last update: **30.10.2023 11:04**

