

## Содержание

В чем польза .....	3
Как работает .....	3




# Оценка качества базового плана до утверждения

## В чем польза

Сокращение трудозатрат и повышение качества оценки планов проектов.

## Как работает

- В проекте создайте и сохраните дискуссию с типом «Запрос на утверждение базового плана»

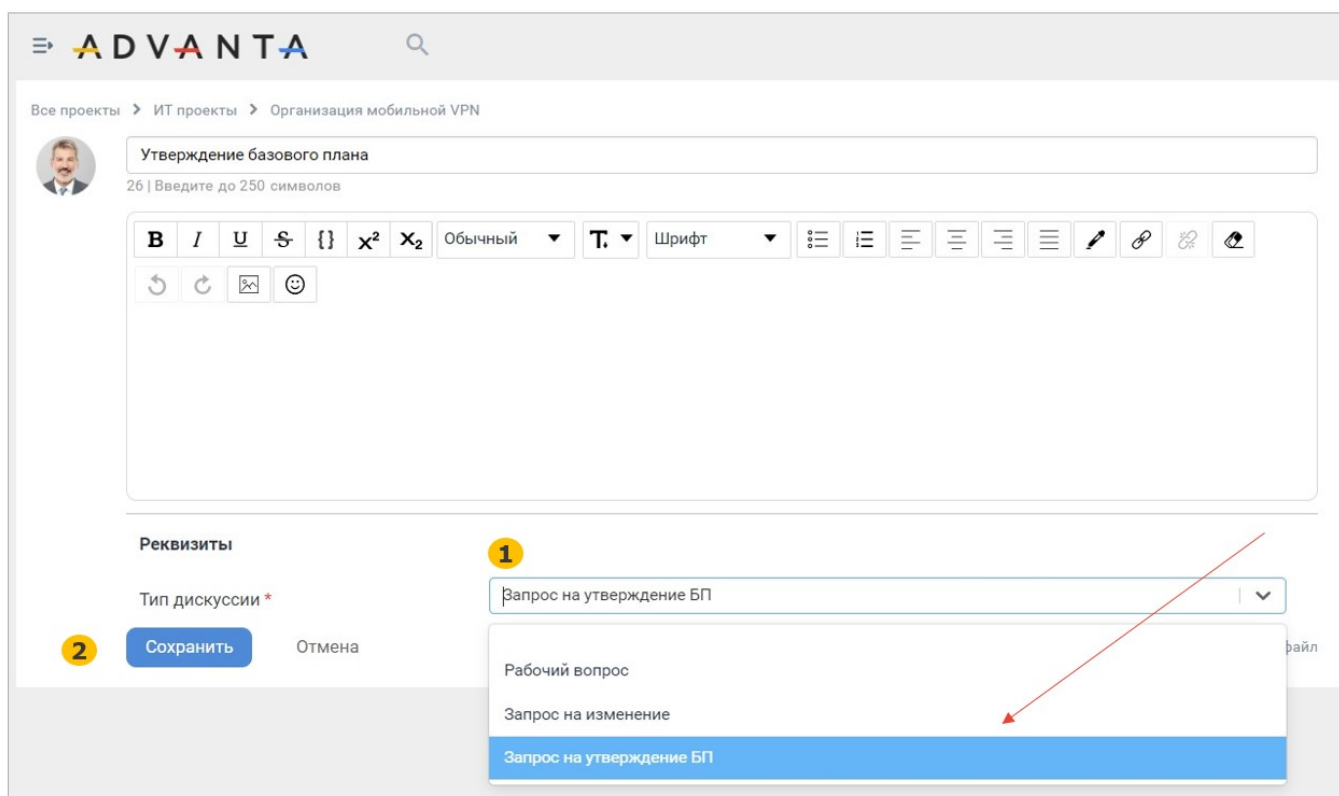


- Цифровой помощник проверит план по нужным критериям
- В дискуссии автоматически опубликуется список проблем и рекомендации по их устранению

**ADVANTA** 🔍

Все проекты > ИТ проекты > Организация мобильной VPN > Дискуссии

### Утверждение базового плана < Назад к списку дискуссий

 **Воронов Олег** 30 октября в 13:51


---


**Реквизиты**

Тип дискуссии \* Запрос на утверждение БП

👍 Нравится   📎 Добавить файл   ↩ Ответить   ✓ Ознакомлен

---

**Цифровой Помощник** →  30 октября в 13:51

 Запрошено утверждение Базового плана по проекту **Организация мобильной VPN**, Руководитель проекта **Воронов Олег**

Дата окончания по ранее утвержденному БП: **15.07.2024**, новая предлагаемая дата завершения проекта: **29.07.2024**. Предложен перенос даты окончания на **10 рабочих дней**.

На ближайший год, от текущей даты, в плане проекта присутствуют Задачи с недостаточной декомпозицией (длительностью более месяца), число таких задач - **2**

В проекте присутствуют работы начало которых на текущий момент просрочено, число просроченных - **1**

В проекте на ближайший год работ недостаточное число контрольных точек, рекомендуется каждый месяц иметь хотя бы одну КТ

**Не рекомендуется утверждение базового плана**

👍 Нравится   ↩ Ответить

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: [https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/plan\\_evaluation?rev=1698672113](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/plan_evaluation?rev=1698672113)

Last update: **30.10.2023 13:21**

