

Содержание

В чем польза	3
Демонстрация сценария	3
Как работает	3

Оценка качества базового плана до утверждения


В чем польза

Сокращение трудозатрат и повышение качества оценки планов проектов.

Демонстрация сценария

Как работает

- В проекте создайте и сохраните дискуссию с типом «Запрос на утверждение базового плана»

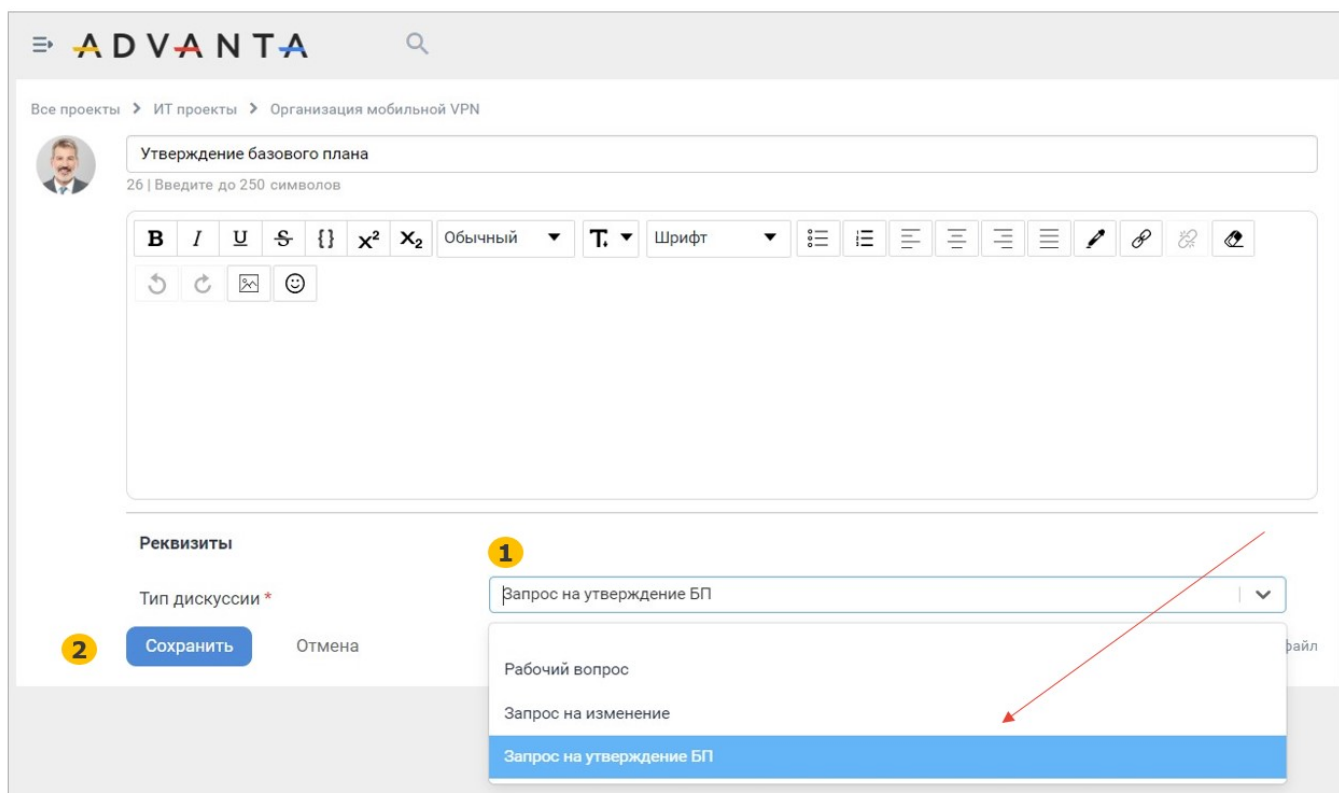


** Цифровой помощник проверит план по нужным критериям * В дискуссии автоматически опубликуется список проблем и рекомендации по их устранению*

ADVANTA





Все проекты > ИТ проекты > Организация мобильной VPN > Дискуссии


Утверждение базового плана < Назад к списку дискуссий


 **Воронов Олег** 30 октября в 13:51

Реквизиты

Тип дискуссии * Запрос на утверждение БП

 Нравится  Добавить файл  Ответить  Ознакомлен

Цифровой Помощник →  30 октября в 13:51

 Запрошено утверждение Базового плана по проекту **Организация мобильной VPN**, Руководитель проекта **Воронов Олег**



Дата окончания по ранее утвержденному БП: **15.07.2024**, новая предлагаемая дата завершения проекта: **29.07.2024**. Предложен перенос даты окончания на **10 рабочих дней**.

На ближайший год, от текущей даты, в плане проекта присутствуют Задачи с недостаточной декомпозицией (длительностью более месяца), число таких задач - **2**

В проекте присутствуют работы начало которых на текущий момент просрочено, число просроченных - **1**

В проекте на ближайший год работ недостаточное число контрольных точек, рекомендуется каждый месяц иметь хотя бы одну КТ

Не рекомендуется утверждение базового плана

 Нравится  Ответить

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/plan_evaluation?rev=1701246012

Last update: **29.11.2023 08:20**

