

Содержание

В чем польза	3
Демонстрация сценария	3
Как работает	3

Оценка качества базового плана до утверждения


В чем польза

Проверка качества базового плана с применением Цифрового помощника помогает сэкономить время руководителя и избежать возможных ошибок в планировании.

Демонстрация сценария

Как работает

- Создайте и сохраните в проекте дискуссию с типом «Запрос на утверждение базового плана», при необходимости запросите в обсуждение коллег

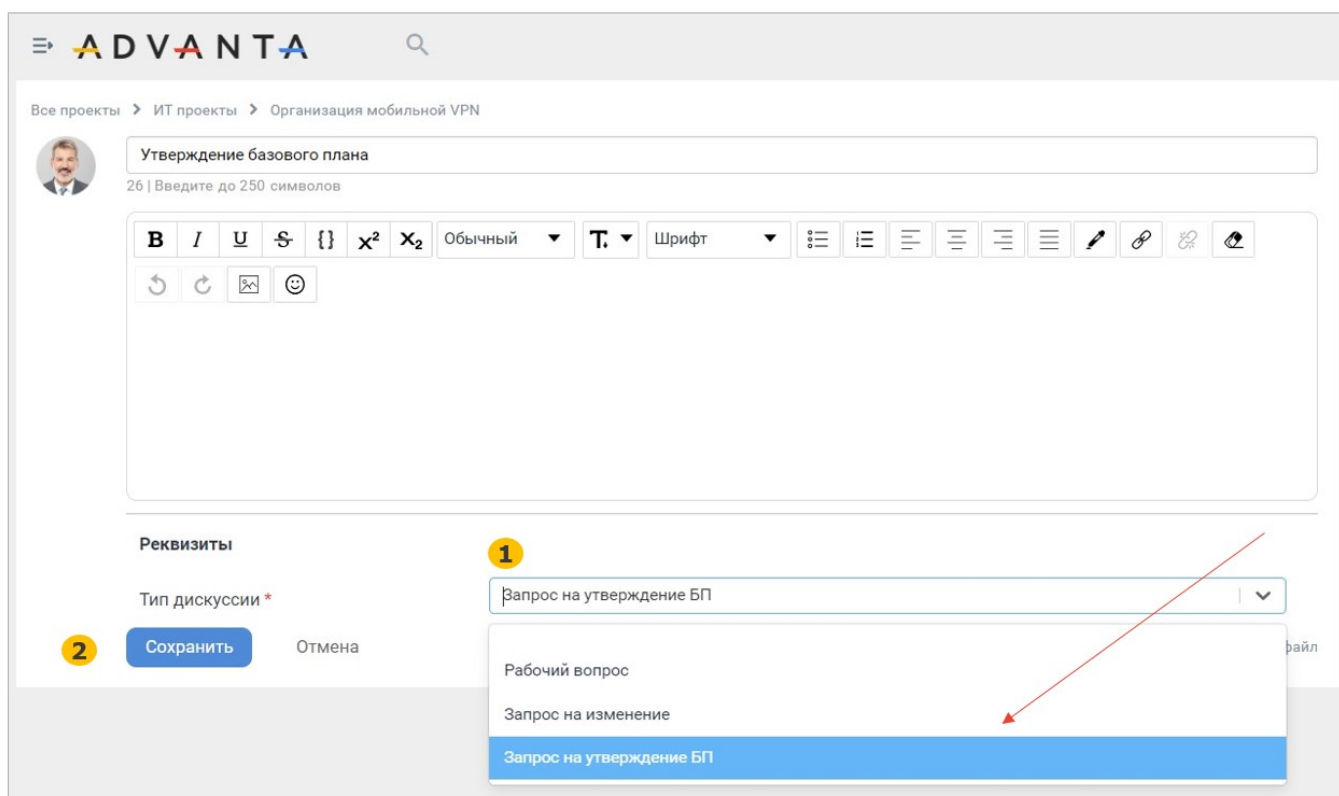

- Цифровой помощник обработает данные по проекту и проверит план по нужным критериям
- В дискуссии автоматически опубликуются результаты проверки, чтобы руководитель проекта и все участники могли ознакомиться с информацией и принять участие в дальнейшем обсуждении. Если утверждение базового плана не рекомендовано, в ответе отразятся причины и замечания, которые следует устранить

ADVANTA

Все проекты > ИТ проекты > Организация мобильной VPN > Дискуссии

Утверждение базового плана < Назад к списку дискуссий

Воронов Олег 30 октября в 13:51

Реквизиты

Тип дискуссии * Запрос на утверждение БП

Нравится Добавить файл Ответить Ознакомлен

Цифровой Помощник → + 30 октября в 13:51

Запрошено утверждение Базового плана по проекту Организация мобильной VPN, Руководитель проекта Воронов Олег

Дата окончания по ранее утвержденному БП: 15.07.2024, новая предлагаемая дата завершения проекта: 29.07.2024. Предложен перенос даты окончания на 10 рабочих дней.

На ближайший год, от текущей даты, в плане проекта присутствуют Задачи с недостаточной декомпозицией (длительностью более месяца), число таких задач - 2

В проекте присутствуют работы начало которых на текущий момент просрочено, число просроченных - 1

В проекте на ближайший год работ недостаточное число контрольных точек, рекомендуется каждый месяц иметь хотя бы одну КТ

Не рекомендуется утверждение базового плана

Нравится Ответить

Возможны и другие сценарии работы Цифрового помощника с базовым планом. Например, проверка качества базового плана в ходе согласования Проектным офисом. Проектный офис сохраняет базовый план, Цифровой помощник проверяет его. Если результаты проверки положительные, то проект автоматически переводится в статус «Реализация проекта», а Руководителю проекта направляется уведомление.

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/triggers/library/plan_evaluation?rev=1705562963

Last update: 18.01.2024 07:29

