

Содержание

Проблемы	3
Выгоды	3
Назначение	3
Компоненты решения	3
Автоматизируемые функции и процессы	3
Описание и иллюстрации	3
Обратная связь	6

F05 Сохранение базового плана по стоимости проекта (бюджет проекта)

Финансовый контур, через тсл

Проблемы

1. Отсутствие базового плана по стоимости проекта.
2. Нет возможности контролировать плановые и фактические расходы по проекту в сопоставлении с утвержденным бюджетом.
3. Расходование денег на проекты превышает ожидания.

Выгоды

1. Контроль стоимости выполнения проектов.

Назначение

1. Сохранение базового плана по стоимости.

Компоненты решения

- настройки ИСУП: объекты, справочники, отчёты;
- триггер.


Автоматизируемые функции и процессы

- Определение бюджета


Описание и иллюстрации

Шаг 1. Руководитель проекта формирует новую версию бюджета и отправляет ее на согласование (Формирование и отправка бюджета на согласование подробно описано в решении [F04 Формирование и отправка на согласование бюджета проекта](#))

Шаг 2. Сохранение базового плана по стоимости проекта происходит после успешного согласования бюджета проекта

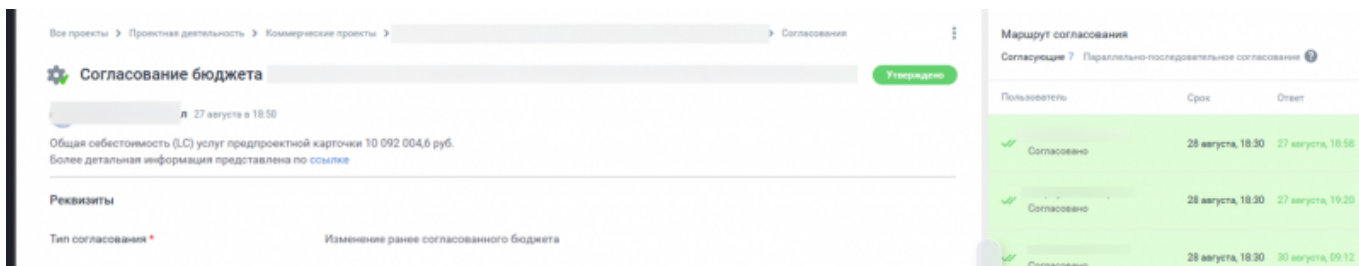

Триггер фиксирует ранее отправленный на согласование бюджет проекта как утвержденный и записывает его в специальный справочник - «Утвержденный бюджет».

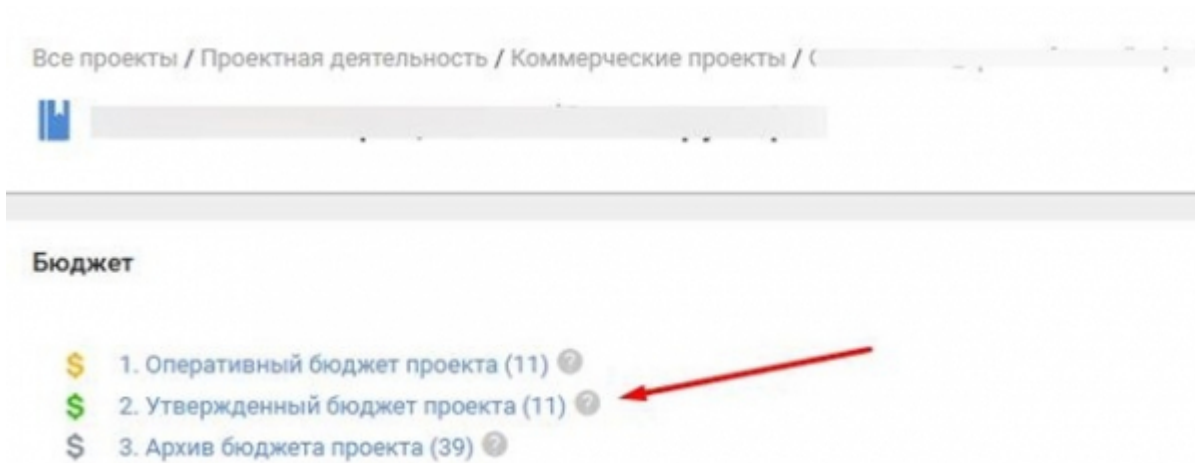

После сохранения базовой стоимости проекта просмотр утвержденного бюджета в консолидированном виде возможен через специально настроенный отчет «Утвержденный бюджет проекта».

Проект

- ★ Главная
- Гант
- Дискуссии (0)
- Документы (...)
- Согласования (...)
- Участники (...)
- Формы (...)

▲ Бюджет проекта (3)

- 1. Оперативный бюдж...
- 2. Утвержденный бюд...
- 3. Архив бюджета про...

бюджет проекта 🔍 Открыть фильтр 🛠 Открыть панель инструментов

Код услуги	Наименование услуги	Статья затрат	Исполнитель	Производитель	Цена за ед.-руб.	Часы/Количество	Себестоимость, руб.	Себестоимость (LC)
Проект								
Дата формирования бюджета: 17.09.2024								
Плановая дата начала проекта: 23.08.2024								
Плановая дата окончания проекта: 21.02.2025								
Статус: Оперативный								
Версия: 7								
Руководитель проекта: I								
Согласованная скидка: 0%								
Коэффициент LC: 1,0269								
Этап 1 TNL Проектирование								
805983	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ		Пл	3 892,00	30	116 760,00	116 760,00
805998	РП 3 уровень	ФОТ		Пл	2 622,00	54	141 588,00	141 588,00
881116	Риски этапа проектирования (~ 7% от стоимости работ этапа)	Риски		Pla	330 000,00	1	330 000,00	330 000,00
872542	Проектирование	Подрядчики		OC	1 980 000,00	1	1 980 000,00	2 033 262,00
881115	Идентификатор комплекта			SE	1,00	1	1,00	1,00
Этап 2 Интеграция Системы управления офисным пространством Merusoft SmartOffice с приложениями корпоративной платформы TN Life								
805998	РП 3 уровень	ФОТ		Пл	2 622,00	120	314 640,00	314 640,00
805983	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ		Пл	3 892,00	60	233 520,00	233 520,00
805983	Ведущий архитектор ИТ	ФОТ		Пл	3 892,00	20	77 840,00	77 840,00
881117	Риски этапа интеграции (~ 7% от стоимости работ этапа)	Риски		Pla	300 000,00	1	300 000,00	300 000,00
872534	Интеграция Системы управления офисным пространством с приложениями корпоративной платформы	Подрядчики		OC	6 372 960,00	1	6 372 960,00	6 544 392,62
881118	Идентификатор комплекта			SE	1,00	1	1,00	1,00
ИТОГО							9 867 310,00	10 092 004,62

Шаг 3. Дополнительно система сохраняет ранее утвержденный бюджет как версию

(Сохранение версии бюджета подробно описано в решении [F06 Версионность бюджета проекта](#)).

Обратная связь

****Узнайте о возможностях платформы и подберите лучшее решение на базе ADVANTA****
[Хочу так же](#)

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/opportunities/projects_and_tasks/planning/project_budget

Last update: **16.01.2026 14:10**

